



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 134/2019

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “Implantação de Infraestrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – APA RIO MACACU”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 001/2019, o Parecer Técnico Final Nº 001/2019, o Ofício INEA/PRES Nº 1080/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 173/2019, a CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ Nº 124/2019, o Parecer Técnico Final Nº 016/2019 (DIBAPE) e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

DIEGO KHOURI MOTA

ID 5007762-7

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE
“IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU – APA RIO MACACU”**

Processo Administrativo SEA: E-07/000.295/2010

Proponente: Assessoria de Projetos Especiais – APES
Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Implantação de Infraestrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – APA RIO MACACU”.

O Projeto foi apresentado na 26ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 01/07/2010, com a Deliberação CCA nº 022/2010, de 04/08/2010, com um custo estimado no valor de R\$ 4.585.450,30 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos), porém foi retirado da pauta aguardando a resolução de algumas adequações.

O Projeto foi aprovado parcialmente na 27ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 05/08/2010 e Deliberação CCA nº 023/2010, de 12/08/2010, totalizando o valor de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), aguardando posterior aprovação integral do Projeto, com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO – CSA 2”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 11/2007.

Foram apresentados os itens pendentes do Projeto na 28ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 15/09/2010 e Deliberação CCA nº 024/2010, de 07/10/2010, e o projeto teve a sua aprovação integral, passando do valor de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), para o valor de R\$ 2.987.363,67 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

O presente projeto foi executado parcialmente conforme CFF, em 03 objetivos específicos e atividades inerentes, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e Termos de Referências, foram atendidas.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata da Implantação da Infraestrutura da APA Rio Macacu, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, não conseguindo constatar, após a visita realizada a Sede e levantamento fotográfico, a execução do objetivo específico A2 (Recomposição Florestal no entorno da Sede da APA MACACU), ficando um saldo remanescente de R\$ 57.469,33 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta três centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Urbanização e Implantação de Infraestrutura da APA MACACU. Valor Previsto de R\$ 1.945.098,12 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, noventa e oito reais e doze centavos);
- **Objetivo Específico A2** – Recomposição Florestal no Entorno da Sede da APA MACACU. Valor Previsto de R\$ 468.378,54 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);
- **BDI** – Referente aos Objetivos A1 e A2. Valor Previsto de R\$ 482.695,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos);
- **Objetivo Específico A3** – Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Logo da APA. Valor Previsto de R\$ 91.191,68 (noventa e um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou parcialmente as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, pois na visita realizada a Sede e levantamento fotográfico, não ficou constatado a execução do objetivo específico A2 (Recomposição Florestal no entorno da Sede da APA MACACU).





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Parecer Técnico Final nº 016/2019 (DIBAPE), o Parecer Técnico Final nº 001/2019 (APES) e o Termo de Encerramento do projeto nº 001/2019 (APES), elaborados pela atual Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado parcialmente, devido a não confirmação do objetivo específico A2 (Recomposição Florestal no entorno da Sede da APA MACACU), após visita realizada na Sede.

Em anexo ao Parecer Final, encontra – se a documentação atestando parcialmente os pagamentos, onde comprovam o acompanhamento parcial do projeto, constatando um saldo final de R\$ 57.469,33 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta três centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019.

LUIZ DAVID
ID nº: 51020700
Luiz David Brito Martins
ID - 51020700
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS


TERMO DE ENCERRAMENTO Nº 001/2019

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MACACU – APA RIO MACACU

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto para de “Implantação da Infraestrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do rio Macacu – APA Rio Macacu”, no valor de R\$ 2.987.363,67 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), com um saldo remanescente de R\$ 57.469,33 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos).

Atestamos que todas as especificações constantes no Plano de Trabalho foram atendidas, aguardando apenas a comprovação do Objetivo A2 (Recomposição Florestal no Entorno da Sede da APA MACACU), conforme a documentação comprobatória analisada do Processo Administrativo nº E-07/000.295/2010 e visita realizada na Sede.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2019.



JOSÉ MAURO DE FARIAS JUNIOR



Secretaria de
Estado de
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

PARECER TÉCNICO FINAL

SEAS	SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS	Parecer n.º 001/2019				
	SUBSECRETARIA EXECUTIVA – SUBEXEC	Data: 20/12/2019				
ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS - APES						
PROPONENTE:	Assessoria de Projetos especiais – Antiga Assessoria Técnica do Gabinete - ASSESP/SEA.					
PROJETO:	Projeto de Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.					
Empresa/ Financiadora:	Fonte TKCSA Companhia Siderúrgica do Atlântico – CSA 2.	Processo: E-07/515.092/2012 e E-07/000.295/2010				
Empresa Executora	-	Termo de Referência: -				
x	Obras e Instalações	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Prestação de Serviços</td> <td></td> <td> Materiais e Equipamentos</td> </tr> </table>		Prestação de Serviços		Materiais e Equipamentos
	Prestação de Serviços		Materiais e Equipamentos			

DESCRIÇÃO GERAL

Data de Aprovação do Projeto	07/10/2010
Valor total do projeto:	R\$ 2.987.363,67
Valor executado:	R\$ 2.929.894,34
Saldo remanescente:	R\$ 57.469,33
Objetivo Geral do Projeto:	Construção da sede administrativa da APA da Bacia do Rio Macacu, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da Unidade de Conservação e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da Unidade de Conservação.

INTRODUÇÃO

O projeto de "Implementação de Estrutura Física da área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu" (APA MACACU), foi apresentado inicialmente na 26ª Reunião Ordinária da CCA, realizada no dia 1 de julho de 2010, com a Deliberação CCA nº 022/2010, de 04 de agosto de 2010, com um custo estimado no valor de R\$ 4.585.450,30 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos), porém foi retirado da pauta aguardando a resolução de algumas adequações.

Na 27ª Reunião Ordinária da CCA, realizada em 05 de agosto de 2010, com a Deliberação CCA nº 023/2010, de 12 de agosto de 2010, obteve a aprovação parcial para a construção da Edificação da sede, com um custo estimado no valor de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), aguardando



posterior aprovação integral do Projeto, após a apresentação do Projeto complementar para a Infraestrutura Básica e Recomposição Florestal do módulo da APA, compreendido entre o Rio Macacu e a BR-116.

Na 28ª Reunião Ordinária da CCA, realizada em 15 de setembro de 2010, com a Deliberação CCA nº 024/2010, de 07 de outubro de 2010, realizou a apresentação dos itens pendentes citados na reunião anterior, e o Projeto teve a sua aprovação por completo, passando do teto orçamentário de R\$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), aprovado na 27ª Reunião Ordinária CCA, para o valor de R\$ 2.987.363,67 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), com os valores divididos para cada etapa do Projeto de "Construção da Sede da APA do Rio Macacu, Centro de Referência Água-Floresta e seus Complementos.

Na 33ª Reunião Ordinária da CCA, realizada em 29 de junho de 2011, foi aprovado o remanejamento orçamentário de recursos, dentro do limite de 20%, sem alteração de escopo.

Foi firmado um contrato nº 067/2011, entre o Funbio e a empresa AZZUK ENGENHARIA LTDA., em 13 de julho de 2011, para a execução da Construção da Sede da APA Macacu, Infraestrutura, Recomposição Vegetal e Tratamento Paisagístico, no valor de R\$ 2.781.834,02, para o Projeto de "Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu".

Abaixo ficaram divididos os valores destinados a cada etapa:

- **Etapa 01** - Construção da Sede da APA. Valor Previsto de R\$ 932.362,14 (novecentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos);
- **Etapa 02** - Infraestrutura e Urbanização. Valor Previsto de R\$ 889.455,61 (oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos);
- **Etapa 03** - Recomposição Florestal. Valor Previsto de R\$ 468.378,54 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);
- **Etapa 04** - Administração. Valor Previsto de R\$ 123.280,37 (cento e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e trinta e sete centavos);
- **Etapa 05** - BDI. Valor Previsto de R\$ 482.695,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos);
- **Etapa 06** - Aquisições de Mobiliário, Equipamento e Logo da APA. Valor Previsto de R\$ 91.191,68 (noventa e um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos);

Após a aprovação do projeto, o teto orçamentário foi retificado ficando no valor de R\$ 2.987.363,67. (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

O projeto tem como objetivo específico "Consolidar e Prover de Completa Infraestrutura Física a APA da Bacia do Rio Macacu, através da urbanização de seu entorno imediato com a construção de Estacionamento, Ciclovia e Recomposição Ambiental no entorno da sede.

O Projeto foi proposto pela SEAS (Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade), através da "Assessoria Técnica de Gabinete" e da "Superintendência de Biodiversidade", ficando como responsabilidade da DIBAPE, apenas a gestão das aquisições destinadas a Unidade de Conservação, conforme



comprovado através do Ofício INEA/DIBAP nº 355/2012, anexado aos processos administrativos E-07/000.295/2010 e E-07/515.092/2012.

O projeto foi reapresentado com as adequações e complementações solicitadas na reunião anterior, sendo previstas as seguintes atividades/intervenções:

- Construção da sede administrativa da Unidade de Conservação e aquisição de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório;
- Sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, drenagem de águas pluviais, iluminação pública e combate a incêndios;
- Implantação de ciclovia a partir de pneu reciclado;
- Estacionamento;
- Recomposição da mata ciliar do entorno da sede com vegetação nativa.

Foi reiterado que esta APA é impactada diretamente pelo COMPERJ, e que as intervenções ocorreriam em terreno público cedido pela prefeitura.

RESULTADOS

O presente Parecer tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto de "Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu", no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto em questão totaliza um aporte financeiro da Compensação Ambiental de R\$ 2.987.363,67 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Urbanização e Implantação de Infraestrutura da APA MACACU. Valor Previsto de R\$ 1.945.098,12 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, noventa e oito reais e doze centavos);
- **Objetivo Específico A2** – Recomposição Florestal no Entorno da Sede da APA MACACU. Valor Previsto de R\$ 468.378,54 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);
- **BDI** – Referente aos Objetivos Específicos A1 e A2. Valor Previsto de R\$ 482.695,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos);
- **Objetivo Específico A3** – Aquisição de Mobiliário, Equipamento e Logo da APA. Valor Previsto de R\$ 91.191,68 (noventa e um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Abaixo destacamos o TCCA, Atas, Deliberações e o valor do Projeto:

TCCA	VALOR	ATAS/DELIBERAÇÕES CCA
Projeto de Implantação de estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - (CSA – TCCA 11/2007)	R\$ 2.987.363,67	<p>26º Reunião Ordinária da CCA, realizada no dia 1 de julho de 2010, com a Deliberação CCA nº 022/2010, de 04 de agosto de 2010.</p> <p>Na 27º Reunião Ordinária da CCA, realizada em 05 de agosto de 2010, com a Deliberação CCA nº 023/2010, de 12 de agosto de 2010.</p> <p>Na 28º Reunião Ordinária da CCA, realizada em 15 de setembro de 2010, com a Deliberação CCA nº 024/2010, de 07 de outubro de 2010.</p> <p>Na 33º Reunião Ordinária da CCA, realizada em 29 de junho de 2011.</p>

Abaixo destacamos os produtos realizados durante o projeto, correspondentes a um total de 11 medições, conforme CFF, Plano de Trabalho e Termo de referência nº 2011.04071.729541-10 do projeto e contrato Funbio nº 067/2011:

Histórico	Parecer Técnico	TRA	Número da Nota Fiscal	Valor
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 01/11	Parecer ASTEC nº 01/11	ASSESP/SEA – 1ª etapa	00000028	R\$ 391.324,39
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 02/11	Parecer ASTEC nº 02/11	ASSESP/SEA – 2ª etapa	00000031	R\$ 141.709,18
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 03/11	Parecer ASTEC nº 03/11	ASSESP/SEA – 3ª etapa	00000032	R\$ 75.543,27
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 04/11	-	ASSESP/SEA – 4ª etapa	00000036	R\$ 401.663,43
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 05/11	-	ASSESP/SEA – 5ª etapa	00000037	R\$ 439.749,94



Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 06/11	-	ASSESP/SEA – 6º etapa	00000038	R\$ 304.764,21
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 07/11	-	ASSESP/SEA – 7º etapa	00000041	R\$ 191.053,83
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 08/11	-	ASSESP/SEA – 8º etapa	00000043	R\$ 265.526,91
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 09/11	-	ASSESP/SEA – 9º etapa	00000046	R\$ 217.200,27
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 10/11	-	ASSESP/SEA – 10º etapa	00000051	R\$ 137.499,03
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 11.1/11	-	-	00000072	R\$ 125.141,85
Implantação da Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu – Parcela 11.2/11	-	-	00000087	R\$ 90.657,71

Total (R\$)	R\$ 2.781.834,02
Total Medido (R\$)	R\$ 2.781.834,02
Saldo à Medir (R\$)	R\$ 0,00

Porém, como a Coordenação do projeto da época não é a mesma, não temos como comprovar se todos os objetos foram alcançados, conforme Plano de Trabalho.

Sendo assim realizamos uma visita a APA MACACU para realizar uma inspeção visual e fotográfica da Sede, para que em conjunto com todo o histórico de documentos comprobatórios das medições, existentes no processo físico, e a prestação de contas enviada pelo FUNBIO, nos ajude a aprovar essa prestação de contas final do projeto.

Abaixo encontra – se o relatório fotográfico da Sede:







SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-5906
www.seas.rj.gov.br





SEAS Secretaria de
Estado de
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-312 – Tel.: 2332-5906
www.seas.rj.gov.br




SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-5906
www.seas.rj.gov.br

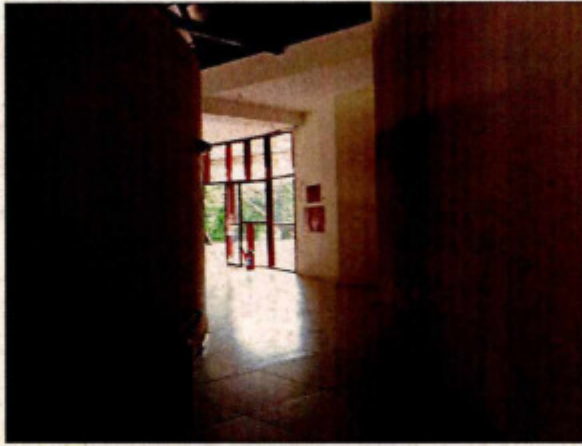

SEAS Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Avenida Venezuela, 110 – Praça Mauá – Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-5906
www.seas.rj.gov.br



CONCLUSÃO

Tendo em vista o histórico levantado através das atas e deliberações da Câmara de Compensação Ambiental – CCA – RJ e com base nas informações contidas no Processo Administrativo E-07/000.295/20110, não é possível afirmar que o Projeto alcançou integralmente os seus objetivos, pois o que consta anexado são apenas as Notas Fiscais de todas as medições e apenas a metade dos Pareceres Técnicos e TRA's, conforme tabela descrita neste Parecer Técnico.

Porém foi comprovado em visita a Sede, através de relatório fotográfico, que a sede da Unidade de Conservação foi construída e dotada de todos os Equipamentos necessários ao seu funcionamento, oferecendo uma melhor condição aos seus colaboradores e ao desenvolvimento das atividades de monitoramento, Uso Público e Educação Ambiental.

Cabe ressaltar que não conseguimos comprovar o Objetivo Específico A2 – Recomposição Florestal no Entorno da Sede da APA MACACU, com um valor previsto de R\$ 468.378,54 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), pois não conseguimos identificar visualmente e nenhum dos atuais funcionários puderam nos evidenciar o mesmo.

Sendo assim, vejo a necessidade de uma posterior comprovação referente a este Objetivo do projeto.

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, com a prestação de contas elaborada pelo Gestor Operacional Funbio, constando todos os pagamentos das medições e confirmados com as Notas Fiscais apensados neste Parecer e relatório fotográfico, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas a execução financeira das despesas e seu controle, comprovando total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo o saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

De acordo com o histórico de pagamentos das 11 etapas apensadas a este Parecer, comprovando o pagamento das medições e atestando que o projeto foi executado.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimentos e aceites parciais, pareceres técnicos parciais, notas fiscais integrais, emitidos pelos coordenadores do projeto, constantes no processo administrativo E-07/000.295/2010, e relatório fotográfico realizado em visita a Sede da APA, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2019.


José Mauro de Farias Junior





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 1080

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.
José Mauro de Farias Junior
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e Termo de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento do Projeto “Implantação de Infraestrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

RECEBIDO
EM: 17/09/19
SEAS / SURFIP

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 173

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Para: Gabinete da Presidência – GP

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.
Assunto: Encerramento do projeto “Implantação de Infraestrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu”.

Senhor Presidente,

Encaminhamos Parecer Técnico Final, Relatório de prestação de contas e o Termo de Encerramento do projeto listado na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 124, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas -
ID: 4348049-7

INEA
CADASTRADO
Nº 696902

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 124.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

De: Diretoria Adjunta – DIBAPE.

Para: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE.

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento projeto “Implantação de Infraestrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu”


Senhor Diretor,

Após verificação pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência o Parecer Técnico Final nº 16/2019, o qual apresenta a descrição das aquisições acompanhadas pela DIBAPE, no âmbito do referido projeto, bem como o Relatório de Prestação de Contas referente ao projeto em referência.

Tendo em vista que o proponente deste projeto foi a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), a qual ficou responsável pelo acompanhamento das obras da UC, deverá ser elaborado pela SEAS parecer técnico final complementar, relativo às ações executadas no âmbito das obras de construção da sede administrativa da APA Macacu.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Julia Kishida Bochner
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE
ID: 4347935-9

inea instituto estadual
do ambiente


SEAS Secretaria de
Estado de
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVAR O 1000

J³ INEA 696893

PARECER TÉCNICO FINAL

	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS (DIBAPE)		Parecer n.º 16/2019.
			Data: 09/09/2019.
PROPONENTE:	Antiga GEUSO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA.		
PROJETO:	Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.		
Empresa/ Financiadora:	Fonte	TKCSA Companhia Siderúrgica – CSA 2.	Processo: E-07/515.092/2012.
	Obras e Instalações	Prestação de Serviços	X Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Data de aprovação do projeto:	07/10/2010.
Valor total do projeto:	R\$ 2.987.363,67.
Valor executado:	R\$ 2.929.894,34.
Saldo remanescente:	R\$ 57.469,33.
Objetivo Geral do Projeto:	Construção da sede administrativa da APA da Bacia do Rio Macacu, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da UC e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

INTRODUÇÃO

O projeto, destinado à implementação da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu (APA Macacu), foi inicialmente apresentado na 26ª Reunião Ordinária da CCA, ocorrida em 14 de julho de 2010, quando foi retirado de pauta visando adequações. O mesmo foi novamente apresentado na 27ª Reunião Ordinária da CCA, ocorrida em 05 de agosto de 2010, quando obteve aval para a construção da sede, porém ficando sua aprovação integral pendente da apresentação de projeto complementar para infraestrutura básica e recomposição florestal.

Finalmente, após a apresentação das pendências elencadas na reunião anterior, o projeto foi integralmente aprovado na 28ª Reunião Ordinária da CCA, ocorrida em 15 de setembro de 2010, legitimada pela Deliberação CCA n° 24/2010, de 07 de outubro de 2010, a qual retificou o teto orçamentário para R\$ 2.987.363,67 (dois milhões novecentos e oitenta e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), a serem distribuídos conforme tabela a seguir.




Tabela1. Distribuição dos recursos (previsão).

Atividade	Valor previsto
Construção da sede da APA	R\$ 932.362,14
Infraestrutura e urbanização	R\$ 889.455,61
Recomposição florestal	R\$ 468.378,54
Administração	R\$ 123.280,37
BDI	R\$ 482.695,33
Aquisição de mobiliários, equipamentos e logomarca	R\$ 91.191,68
Total	R\$ 2.987.363,67

O projeto que tinha como objetivos específicos consolidar e prover de completa infraestrutura física a APA da Bacia do Rio Macacu através da urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento, ciclovia e recomposição ambiental no entorno da sede, foi proposto pela SEAS, através da então Assessoria Técnica de Gabinete e da Superintendência de Biodiversidade, ficando a cargo da DIBAPE somente a gestão das aquisições destinadas à unidade de conservação, conforme Ofício/INEA/DIBAP N° 355/2012, anexado aos processos administrativos E-07/000.295/2010 e E-07/515.092/2012.

Dessa forma, o presente parecer técnico objetiva apresentar, exclusivamente, os resultados relacionados à aquisição de mobiliários, equipamentos e logomarca, cabendo à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) a elaboração de Parecer Técnico Final Complementar com a descrição dos resultados referentes às obras de construção da sede administrativa da UC.

RESULTADOS

- Aquisição de mobiliários, equipamentos e logomarca:

Valor previsto CCA: R\$ 91.191,68

Valor previsto após remanejamento: R\$ 148.060,32.

Valor realizado: R\$ 148.060,32.

Saldo: R\$ 0,00.

Resultados:

Foram adquiridos ao longo da vigência do projeto equipamentos, mobiliários e a execução de projeto gráfico referente à logomarca da UC.

O valor inicialmente destinado às referidas aquisições foi ampliado, possibilitando a compra de mais

bens do que o previsto, conforme a listagem constante no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo.

CONCLUSÃO


Tendo em vista o histórico levantado através das atas e deliberações da Câmara de Compensação Ambiental – RJ e com base nas informações constantes no processo administrativo E-07/515.092/2012, não é possível afirmar se o projeto alcançou integralmente seus objetivos, uma vez que não consta registro do acompanhamento relativo às obras da sede administrativa no âmbito do processo de acompanhamento da DIBAPE. Desta forma, faz-se necessário a elaboração de Parecer Técnico Final Complementar pela SEAS visando averiguar o êxito do projeto proposto.

No entanto, conclui-se que a sede da UC foi dotada de equipamentos necessários ao seu funcionamento, oferecendo melhores condições aos seus funcionários e ao desenvolvimento de atividades de monitoramento, uso público e educação ambiental.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/515.092/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.




Assinatura do Coordenador

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/515.092/2012, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Diretoria Adjunta



CARTA nº 426/2019

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.

Prezados
Subsecretaria Executiva
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2011 a 22 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ



Período de prestação de contas: 01 de abril de 2011 a 22 de maio de 2019



FUNBIO

SEAS

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/04/2011 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 22/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú - SEA 29.11.01.0002	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 67.790,78	R\$ 2.929.894,34	R\$ 57.469,33
TOTAL		R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 67.790,78	R\$ 2.929.894,34	R\$ 57.469,33
12/08/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº Final

Relação de Despesas

Projeto APA do Rio Macacu

Período: 01/04/2011 a 14/11/2016

Data: 22/07/2019

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1Azzuk Engenharia Ltda	00000880 00000000 28	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da bacia do Rio Macacú - Parcela 1/8	391.324,39	100	27/09/2011	391.324,39
2Azzuk Engenharia Ltda	00000000 31	Implantação da estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Parcela 2/8	141.709,18	100	04/11/2011	141.709,18
3Azzuk Engenharia Ltda	00000929 00000000 32	Implantação da estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Parcela 3/8	75.543,27	100	29/11/2011	75.543,27
4Azzuk Engenharia Ltda	00000880 00000000 36	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da bacia do Rio Macacú - Parcela 4/8	401.663,43	100	19/01/2012	401.663,43
5Azzuk Engenharia Ltda	00000880 00000000 37	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - Parcela 5/8	439.749,94	100	16/02/2012	439.749,94
6Azzuk Engenharia Ltda	00000880 00000000 38	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - Parcela 6/8	304.764,21	100	15/03/2012	304.764,21
7Azzuk Engenharia Ltda	00000880 00000000 41	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - Parcela 7/8	191.053,83	100	17/04/2012	191.053,83
8Azzuk Engenharia Ltda	00000880 00000000 43	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - Referente 31,76% da Parcela Final	265.526,91	100	15/05/2012	265.526,91

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto APA do Rio Macacu	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Azzuk Engenharia Ltda	00000000 46	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - Referente a 25,98% da Parcela Final			217.200,27	100	18/06/2012	217.200,27
10Azzuk Engenharia Ltda	00000880 00000000 51	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - Referente à 16,45% da Parcela Final			137.499,03	100	20/07/2012	137.499,03
11 UNIDESIGN EDIÇÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	00000000 46	Elaboração de desenho de símbolo para a APA Estadual do Rio Macacu			4.200,00	100	30/11/2012	4.200,00
12Nova Casa Bahia S/A	00061220 12	Diversos eletrodomésticos para a APA do Rio Macacu.			11.719,00	100	06/12/2012	11.719,00
13Z de O Lessa Comércio de Móveis	00000512 12	Aquisição de 01 Mesa Oval 2,00 x 1,00 na cor Tabaco para a APA do Rio Macacu			452,00	100	07/12/2012	452,00
14Principado de Asturias Louças Ltda	00000733 78	Aquisição de 01 Garrafa Térmica capacidade 1,8 L para a APA da Bacia do Rio Macacu			92,00	100	12/12/2012	92,00
15Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	00003362 63	Aquisição de 06 Toalheiros para a inauguração da APA da Bacia do Rio Macacu			162,84	100	12/12/2012	162,84
16Paper Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	00000226 80	Aquisição de 5 telefones e 6 saboneteiras para a APA de Macacu			304,26	100	10/01/2013	304,26

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto APA do Rio Macacu	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0034393244	2 aparelhos de ar condicionado Split 24.000 BTUs e 01 cafeteira referentes à APA do Rio Macacu.			4.380,00	100	10/01/2013	4.380,00
18 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006927	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Notebook			4.374,00	100	10/01/2013	4.374,00
19 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	0000002538	Aquisição de 20 Lixeiras capacidade 11 L na cor preta para a APA de Macacu			195,60	100	11/01/2013	195,60
20 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006929	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Projeto -			2.677,00	100	11/01/2013	2.677,00
21 Shopping Matriz Fabril Ltda	0000101708	Projeto para implantação de estrutura física da da APA do Rio Macacú/Mobiliário diversos adquiridos no super matriz aços Ltda - Shopping Matriz			20.274,00	100	11/01/2013	20.274,00
22 Shopping Matriz Fabril Ltda	0000102833	Projeto para implantação de estrutura física da Apa do Rio Macacú- aditivo de preço pela substit. de 67 cadeiras por outras+caras aquelas adquiridas inicialmente.			4.185,00	100	11/01/2013	4.185,00
23 HSRNET Informática Ltda.	0000011802	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Impressora Multifuncional Fax Scanner			1.198,00	100	14/01/2013	1.198,00
24 HSRNET Informática Ltda.	0000011812	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Nobreak -			1.250,00	100	14/01/2013	1.250,00

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Azzuk Engenharia Ltda	0000880 0000000072	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Referente à 14,97% da Parcela Final	125.141,85	100	25/01/2013	125.141,85
26Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0035785707	Tela de projeção e DVD para a APA Macacu.	375,00	100	05/03/2013	375,00
27INOVE COMÉRCIO DE TAPETES LTDA	000000051001	Compra de Capacho para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	320,00	100	25/07/2013	320,00
28CORTIARTE	010820130001	Quadro brilhante branco e quadro de cortiça de parede para a APA Macacú.	217,38	100	01/08/2013	217,38
29Comercio de Persianas Comary de Teresopolis Ltda - ME	102008201301	50% adiantamento referente a fornecimento e instalação de persianas - implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	1.172,50	100	21/08/2013	1.172,50
30Jamef Transportes Ltda.	000042938601	Frete quadros APA Macacu	287,46	100	28/08/2013	287,46
31Comercio de Persianas Comary de Teresopolis Ltda - ME	120920130001	Fornecimento e instalação de persianas - implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	1.172,50	100	13/09/2013	1.172,50
32Azzuk Engenharia Ltda	00000880 000000008701	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - Valor referente ao complemento do pagamento da 11ª Medição - Utilizado para pagamento da Guia de Depósito Judicial do Tribunal de Justiça RJ	90.657,71	100	11/11/2013	90.657,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/04/2011 a 14/11/2016

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto	APA do Rio Macacu	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0859701	Aquisição de tablet para projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - FMA/CSA2Thysse - pagamento único				2.994,00	100	24/11/2014	2.994,00
34Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 8632101	Aquisição de 01 projetor - FMA/APA MACACU - pagamento unico				1.697,00	100	11/12/2014	1.697,00
35Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topográficos Ltda.	00000000 1500901	Aquisição de GPS com câmera - Bacia do Rio Macacú - Pagamento único				1.530,00	100	04/02/2015	1.530,00
36Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0030801	Aquisição de 01 Câmera fotográfica digital e lente Nikon - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico				6.794,00	100	09/07/2015	6.794,00
37JR FOX TENDAS LTDA - EPP	00000000 0073501	Aquisição de 02 Tendas Sanfonadas 3x3 - Projeto para implantação de estrutura física da área de preteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico				2.000,00	100	30/10/2015	2.000,00
38Dibrapo Comércio e Importação Ltda	00000000 1284001	Aquisição de 04 Binóculos - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico				1.080,00	100	24/03/2016	1.080,00
39Girocenter do Brasil	00010000 0077001	Aquisição de 01 Estante de Aço - APA do Rio Macacú - Pagamento Unico				608,00	100	20/07/2016	608,00
40Jaguar Máquinas e Ferramentas Motorizadas LTDA- ME	00000000 0813401	Aquisição de 01 Roçadeira e 01 Soprador - Projeto APA do Rio Macacu - Pagamento Unico				4.558,00	100	09/08/2016	4.558,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/04/2011 a 14/11/2016

PRESTAÇÃO Nº Final

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 14/11/2016

Data: 22/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto APA do Rio Macacu		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			2.862.103,56			2.862.103,56



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Período: 01/09/2016 a 22/05/2019

Componente: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú

Categoria:

Data: 12/08/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú

Data: 12/08/2019

Período: 01/09/2016 a 22/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		325662	- Aquisição de 01 (um) mini trator cortador de grama à gasolina e 01 mini trator cortador de grama para a APA do Rio Macacu.	15.570,00	0,00	2.000,00	28/09/2018		2.000,00
2	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		325662	- Aquisição de 01 (um) mini trator cortador de grama à gasolina e 01 mini trator cortador de grama para a APA do Rio Macacu.	15.570,00	0,00	13.570,00	28/09/2018		13.570,00
3	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		326838	- Aquisição de 01 Ar condicionado 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú	6.950,46	0,00	6.950,46	03/10/2018		6.950,46
4	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		326840	- Aquisição de 02 Ar condicionados 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú.	3.554,80	0,00	3.554,80	03/10/2018		3.554,80
5	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A		328678	- Aquisição de 3 nobreak e 2 carrinho para CPU - Projeto APA do Rio Macacú	1.839,26	0,00	117,17	18/10/2018		117,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú

Data: 12/08/2019

Período: 01/09/2016 a 22/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A		328678	- Aquisição de 3 nobreak e 2 carrinho para CPU - Projeto APA do Rio Macacú	1.839,26	0,00	1.722,09	18/10/2018		1.722,09
7	Walmart.com		335297	- Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú	234,70	0,00	234,70	20/12/2018		234,70
8	Thekton Comércio, Locações e Construções Eireli		339378	- Frete referente a aquisição de 02 Kits para Academia da Terceira Idade.	1.956,60	0,00	1.956,60	11/02/2019		1.956,60
9	Tryanon Industria e Comercio de Equip. e Mat Esportivos Eireli		339376	Aquisição de kit Academia da Terceira Idade - Projeto APA do Rio Macacú	37.919,66	0,00	37.919,66	12/02/2019		37.919,66
10	Walmart.com		340405	Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú	-234,70	0,00	-234,70	20/02/2019		-234,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú

Data: 12/08/2019

Período: 01/09/2016 a 22/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				85.200,04					67.790,78



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA 2 (Thyssen)


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20110407172954110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	R\$ 2.781.834,02
Fundo Mata Atlântica RJ	20140822133508110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 04 Binóculos - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico	R\$ 1.080,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130809164233110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Fornecimento e instalação de persianas - implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	R\$ 1.172,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20130809164233110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	50% adiantamento referente a fornecimento e instalação de persianas - implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	R\$ 1.172,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127152911110 / 20121127155243110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	2 aparelhos de ar condicionado Split 24.000 BTUs e 01 cafeteira referentes à APA do Rio Macacu.	R\$ 4.380,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130104141125110 / 20130107161454110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Tela de projeção e DVD para a APA Macacu.	R\$ 375,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127155018110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 01 Mesa Oval 2,00 x 1,00 na cor Tabaco para a APA do Rio Macacu	R\$ 452,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127153142110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Notebook	R\$ 4.374,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127153025110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Projektor -	R\$ 2.677,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140923155906110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de tablet para projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - FMA/CSA2Thysse - pagamento único	R\$ 2.994,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140822134436110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 01 projetor - FMA/APA MACACU - pagamento unico	R\$ 1.697,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140822115740110 / 20140825110334110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 01 Câmera fotográfica digital e lente Nikon - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico	R\$ 6.794,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130104141900110 / 20130104143519110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Quadro brilhante branco e quadro de cortiça de parede para a APA Macacú.	R\$ 217,38
Fundo Mata Atlântica RJ	20140822121041110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de GPS com câmera - Bacia do Rio Macacú - Pagamento único	R\$ 1.530,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20150924145503110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 01 Estante de Aço - APA do Rio Macacú - Pagamento Unico	R\$ 608,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127154440110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Impressora Multifuncional Fax Scanner	R\$ 1.198,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127151813110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Nobreak -	R\$ 1.250,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130107160111110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Compra de Capacho para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	R\$ 320,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20151022165642110 / 20151022165421110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 01 Roçadeira e 01 Soprador - Projeto APA do Rio Macacu - Pagamento Unico	R\$ 4.558,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130104141900110 / 20130104143519110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Frete quadros APA Macacu	R\$ 287,46
Fundo Mata Atlântica RJ	20140822134557110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 02 Tendas Sanfonadas 3x3 - Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú - Pagamento Unico	R\$ 2.000,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127152911110 / 20121127154658110 / 20121127155351110 / 20121127163752110 / 20121127163855110 / 20121127152515110 / 20121127143916110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Diversos eletrodomésticos para a APA do Rio Macacu.	R\$ 11.719,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127163159110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 06 Toalheiros para a inauguração da APA da Bacia do Rio Macacu	R\$ 162,84
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127163413110 / 20121127152204110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 5 telefones e 6 saboneteiras para a APA de Macacu	R\$ 304,26
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127160356110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 01 Garrafa Térmica capacidade 1,8 L para a APA da Bacia do Rio Macacu	R\$ 92,00

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - CSA 2 (Thyssen)


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127151706110 / 20121127152810110 / 20121127155740110 / 20121127155816110 / 20121127151951110 / 20121127153403110 / 20121127153507110 / 20121127153753110 / 20121127154350110 / 20121127155602110 / 20121127154246110 / 20121127151902110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Projeto para implantação de estrutura física da da APA do Rio Macacú/Mobiliário diversos adquiridos no super matriz aços Ltda - Shopping Matriz	R\$ 20.274,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127152810110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Projeto para implantação de estrutura física da Apa do Rio Macacú- aditivo de preço pela substit. de 67 cadeiras por outras+caras aquelas adquiridas inicialmente.	R\$ 4.185,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20121127152320110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Aquisição de 20 Lixeiras capacidade 11 L na cor preta para a APA de Macacu	R\$ 195,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20120730115027110	FMA - CSA2 (Thyssen)	Projeto APA do Rio Macacú - (SEA)	Elaboração de desenho de símbolo para a APA Estadual do Rio Macacu	R\$ 4.200,00

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú**

Acordo FMA 04/2016

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

ACORDO FMA - CSA 2 (Thyssen)


SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0319.00022-6	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	- Aquisição de 01 Ar condicionado 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú	R\$ 6.950,46
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0319.00023-4	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	- Aquisição de 02 Ar condicionados 36000 btus - Projeto APA do Rio Macacú.	R\$ 3.554,80
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0319.00031-5 / 2018.0320.00043-9	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	- Aquisição de 3 nobreak e 2 carrinho para CPU - Projeto APA do Rio Macacú	R\$ 1.839,26
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0319.00043-9 / 2018.0319.00044-7	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	- Aquisição de 01 (um) mini trator cortador de grama à gasolina e 01 mini trator cortador de grama para a APA do Rio Macacu.	R\$ 15.570,00
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0319.00040-4	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	- Frete referente a aquisição de 02 Kits para Academia da Terceira Idade.	R\$ 1.956,60
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0319.00040-4	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	Aquisição de kit Academia da Terceira Idade - Projeto APA do Rio Macacú	R\$ 37.919,66
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.0319.00040-4	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	- Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú	R\$ 234,70
Fundo Mata Atlântica RJ		Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-8	Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	Devolução Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú	-R\$ 234,70
