



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Nº 08.2018

Assunto: 8ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 712/2018) devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/08/2018 até 31/08/2018.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016 (Processo E-07/001.180/2017), designada pela Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, tem a observar:

1. Os dados da prestação de contas apresentado à fl. 1492 e 1493, referente ao período do mês de agosto de 2018, estão de acordo com o Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016 (Planilha de ressarcimento do Gestor Operacional), cabendo destacar:
 - a. Após o 2º termo de apostilamento ao AC nº 04/16, os valores aprovados para ressarcimento estão demonstrados conforme abaixo:

DEMONSTRATIVO DE HORAS / VALOR - AGOSTO

Tipologia de Atividades	Qtd de Horas mínimas estabelecidas no acordo (Anexo 4)*	Horas efetivamente realizadas	Horas apuradas	Valor da Hora Anexo 4 (R\$)	Total (R\$)
Gerenciamento de projetos	260	349,50	349,50	180,34	63.028,82
Financeiro	180	366,50	366,50	129,42	47.432,42
Jurídico	72	96,25	96,25	218,52	21.032,55
Informática	24	0	24	159,12	3.818,86
Administração Compras e contratações	350	164	350	169,73	59.405,51
Apoio Administrativo e Comunicação**	-	56,75	56,75	117,75	6.682,32
Supervisão**	-	17,25	17,25	286,42	4.940,74
TOTAL	-	1050,25	1.260,25	1.261,30	206.341,22

*Horas mínimas equivalentes ao cenário de R\$ 15 a R\$ 25 milhões de acordo com o Anexo 4 do Acordo.

** Não fazem parte da equipe mínima. Não foram estabelecidas valores mínimos para estas segundas.

DESPESAS FIXAS	VALOR
----------------	-------



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

Visitas a campo	R\$	5.328,71
Material de escritório e equipamentos	R\$	4.262,97
Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc)	R\$	6.394,45
Transporte	R\$	1.065,74
TOTAL	R\$	17.051,87

DESPESAS VARIÁVEIS	CUSTO POR UNIDADE	VALOR POR UNIDADE*
Chamada de seleção de projetos	R\$ 1.598,62	0
Capacitação de gestores	R\$ 1.065,74	0
Plano de comunicação	R\$ 1.598,62	0
Assistência Técnica monitoramento	R\$ 4.262,97	0
Outras Despesas	-	0
Consultores Ad Hoc	-	0
TOTAL		R\$ 0

QUADRO RESUMO		
VALORES ADEQUADOS HOMEM/HORA	R\$	206.341,22
DESPESAS FIXAS	R\$	17.051,87
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	-
TOTAL	R\$	223.393,09

- O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls. 1492 e 1493, é de R\$ 15 milhões até R\$ 25 milhões.
- Foram efetuadas R\$ 2.462.439,78 de despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental, Carteira de Projetos Aprovados CCA, no período de 01/08 a 31/08/2018, R\$ 97.933,19 na execução de projetos do Instrumento Financeiro Fiduciário e R\$ 912.008,18 no Instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme fls. 1495 a 1509.
- Neste período, o Instrumento I de Compensação Ambiental apresentou R\$ 6.603.439,97 comprometidos com contratos em andamento, R\$ 502.777,93 em pedido de compra emitido e R\$ 20.162.719,37 em solicitações de compras em andamento. Com relação ao Instrumento V, de TAC, R\$ 5.835.755,07 se encontravam comprometidos com contratos em andamentos, conforme relatório às fls. 1511.
- A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$ 223.393,09 (Duzentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e três reais e nove centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 145.646,36, referente à carteira CCA, R\$ 532,00 referente à Carteira Federal, R\$ 4.322,72 à Reserva de Reg. Fundiária, R\$ 34.128,49 referente ao Instr. Fin. Fiduciário, R\$ 435,93 referente ao Instr. Oper. De Restauração Florestal, R\$ 20.594,95 referente ao Instrumento TAC e R\$ 600,77 referente ao Instr. Oper. Outras Fontes e R\$ 17.051,87 referente às despesas fixas, conforme planilhas anexas às fls. 1492 e 1493 apresentadas pelo Gestor Operacional.

2



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- e. Conforme relatório às fls. 1541, foram utilizadas por tipologia de atividade 1050,25 horas, das quais 349,50 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 366,50 para financeiro, 96,25 para jurídico, 164 para administração (compras e contratações), 17,25 para supervisão e 56,75 para apoio administrativo e comunicação. Com relação às horas alocadas por projetos, segue tabela resumo abaixo:

Resumo horas por Instrumento		
I.I Carteira CA CCA		45%
Horas	Projetos	
468,75	40	
I.II Carteira CA Federal		0%
Horas	Projetos	
2,75	1	
I.III Reserva Regularização Fundiária		2%
Horas	Projetos	
15	2	
III Instr. Financ. Fiduciário		14%
Horas	Projetos	
148	2	
IV Instr. Op. Restau. Florestal		0%
Horas	Projetos	
2,25	1	
V Instrumento TAC		6%
Horas	Projetos	
65,5	7	
VI Instr. Op. Outras Fontes		0%
Horas	Projetos	
3	1	
VII Operação e Gestão		33%
Horas	Projetos	
345	1	

- f. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls.1520 a1525, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
2. De acordo com as planilhas apresentadas às fls. 1514 a 1516:

8



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- a) Não foi observado transferências de recursos para o IDG no período,
- b) Foi observada a entrada de recursos no valor de R\$ 6.527,90 referente a Termo de Compromisso 005/2017 – Magé Mineiração Ltda. (em andamento)

Parecer conclusivo:

Observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/08 a 31/08/2018.

Os serviços prestados se encontram em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do Acordo nº04/2016, considerados os valores constantes da planilha anexa ao AC nº 04/16, já apostilados, podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 08/2018 (à fl. 1491) no valor de R\$ 223.393,09 (Duzentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e três reais e nove centavos).

Débora de Moura Calile
ID: 4382531

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório acima. É autorizado assim, o pagamento da solicitação de reembolso no valor de R\$ 223.393,09, com base na tabela, anexo 4, do Acordo de Cooperação nº 04/16, conforme valores respectivamente detalhados abaixo:

- R\$ 201.149,44 – Instrumento de Compensação Ambiental Estadual
- R\$ 532,00 – Instrumento de Compensação Ambiental Federal
- R\$ 435,93 – Instrumento de Restauração Florestal
- R\$ 20.594,95 – Termo de Ajuste de Conduta
- R\$ 680,77 – Outras Fontes


Informamos ainda que conforme Deliberação nº 69/2017 da CCA, "os valores decorrentes de aplicações (rendimentos) excluindo a atualização de principal." serão utilizados como fonte de ressarcimento para reembolso dos Gestores Operacionais, e que, além disso, autoriza "para apropriação dos recursos por parte do Gestor Operacional após análise da Prestação de Contas



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

pela Comissão Gestora, condicionada a possíveis ajustes futuros, devendo posteriormente serem apresentadas à CCA, com ações decorrentes posteriores, caso necessário. "

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2018


PAULO SCHIAVO JUNIOR
ID 2046253-0


RUY VAZ
ID 5082611-8


ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº 712/2018
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA
Av. Venezuela nº 110 - 5º andar
20081-312 - Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: 24ª Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas referente ao período 01/08/2018 a 31/08/2018 para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso dos custos de gestão e execução, com base na Tabela do Anexo 4 do acordo de cooperação nº 04/2016.
- II. Solicitação de reembolso;
- III. Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos.
- IV. Relatório dos processos de aquisições/contratações.
- V. Acompanhamento das entradas de recursos nas contas em nome do Funbio.
- VI. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto, incluindo o detalhamento das horas alocadas por instrumento, por tipologia de atividade e seus respectivos gráficos de alocação.
- VII. Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias.

A presente solicitação de reembolso monta a quantia de R\$ 223.393,09.

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016, informamos que os valores sob gestão do Funbio implicam no enquadramento na 5ª (quinta) faixa de ressarcimento.

Com base na orientação da SEA e praticado em prestações anteriores o ressarcimento dos custos supracitados serão reembolsados após a aprovação conforme tabela abaixo:

C/C	Instrumento	Carteira (a) - Carteira CCA/RJ	Valor
(1) 3000-7	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC		R\$ 201.149,44
1.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (a) - Carteira CCA/RJ	R\$ 145.646,36
1.2	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (c) - Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 4.322,72
1.3	Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário		R\$ 34.128,49
1.4	Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado		R\$ -
1.5	Despesas Fixas (Visitas a Campo, Material de Escritório, Despesas Adm e Transporte)		R\$ 17.051,87
(2) 3008-2	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC		R\$ 532,00
2.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (b) - Carteira CA Federal	R\$ 532,00
(3) 3008-2	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal		R\$ 435,93
3.1	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal		R\$ 435,93
(4) 3009-0	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta		R\$ 20.594,95
4.1	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC CSN e seus respectivos projetos	R\$ 10.362,27
4.2	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC Chevron Estadual e seus respectivos projetos	R\$ 10.232,68
(5) 3010-4	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes		R\$ 680,77
5.1	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes		R\$ 680,77
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)			Total R\$ 223.393,09

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rosamaria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundbio



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03.537.443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 024/2018


Valor: R\$ R\$ 223.393,09 (Duzentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e três reais e nove centavos).

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos do Acordo de Cooperação nº 04/2016 – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do Acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de setembro de 2016, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos dos Instrumentos de operação de projetos sob nossa gestão no período de 01 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao Acordo de Cooperação (anexo 4).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos através dos Instrumentos.**

Local e data: Rio de Janeiro, 15 de outubro 2018.


João Ferraz Fernandes de Mello
Obrigações Legais - FUNBIO

03.537.443/0001-04

FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE

R. Voluntários da Pátria, 286 - 5º Andar

Botafogo CEP 22270-014

RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil Agência 3519-x Conta Corrente 112.001-8

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrada entre SCA e Faveco em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os dados relativos à gestão e execução dos recursos de administração no período de 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018 de acordo com a planilha de custos administrativos anexo ao acordo (Anexo 6).

		Dados de recursos em reais (dois dígitos - de 01 a 03, até 25 mil reais)							
		Tipologia de Atividades	Horas Realizadas	Rebato ¹	Horas Realizadas + Rebato	% de presença da equipe em tempo parcial ²	Equivalente do equipe dedicada por mês ³	Valor (em R\$)	R\$ Total Realizado
Instrumento I - Inst. Teor. de Cooperação Ambiental INUC	Carteira CCA/NU	Gestão de projetos	155,25	122,25	377,50	-	-	R\$ 180,34	R\$ 90,16,58
		Financeiro	07,25	29,51	125,75	-	-	R\$ 129,42	R\$ 16,425,28
		Jurídico	04,00	7,87	61,67	-	-	R\$ 218,52	R\$ 20,075,43
		Informática	0,00	15,95	25,95	-	-	R\$ 159,12	R\$ 3,557,94
		Administração (Compras e Contratações)	135,00	173,37	810,37	-	-	R\$ 160,73	R\$ 52,675,10
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,25	1,87	1,62	-	-	R\$ 117,75	R\$ 190,76	
	Supervisão	1,00	2,54	12,34	-	-	R\$ 286,42	R\$ 3,700,27	
	Total equipe no período - Inst. I - Carteira CCA/NU		346,75		837,55				R\$ 145,946,49
	Carteira CA Federal	Gestão de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -
		Financeiro	7,75	1,25	4,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ 537,08
		Jurídico	1,00	1,00	1,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -
		Informática	1,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ 18,32
		Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 160,73	R\$ -
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -	
Total equipe no período - Inst. I - Carteira CA Federal		2,75		4,06				R\$ 532,00	
Reserva Reg. Fundição	Gestão de projetos	3,50	7,48	16,38	-	-	R\$ 180,34	R\$ 3,062,37	
	Financeiro	5,25	2,38	7,13	-	-	R\$ 129,42	R\$ 387,47	
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ 83,15	
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 160,73	R\$ -	
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25	1,28	1,63	-	-	R\$ 117,75	R\$ 191,69		
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Inst. I - Reserva Reg. Fundição		15,00		24,75				R\$ 4,222,73	
Instrumento II - Inst. Oper. de Douçoa	Gestão de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 160,73	R\$ -	
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Instrumento II		0,00		0,00				R\$ -	
Instrumento III - Inst. Trs. Faltados	Gestão de projetos	7,75	2,37	4,52	-	-	R\$ 180,34	R\$ 887,23	
	Financeiro	198,52	61,88	100,12	-	-	R\$ 129,42	R\$ 25,666,97	
	Jurídico	0,50	0,25	0,50	-	-	R\$ 218,52	R\$ 110,13	
	Informática	0,00	3,04	3,04	-	-	R\$ 159,12	R\$ 801,96	
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 160,73	R\$ -	
Apoio Administrativo e Comunicação	7,50	43,14	48,64	-	-	R\$ 117,75	R\$ 5,727,26		
Supervisão	0,75	2,44	3,23	-	-	R\$ 286,42	R\$ 405,24		
Total equipe no período - Instrumento III		196,52		209,73				R\$ 34,128,49	
Instrumento IV - Inst. Oper. de Restauração Florestal	Gestão de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
	Financeiro	2,25	1,02	3,27	-	-	R\$ 129,42	R\$ 619,20	
	Jurídico	5,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
	Informática	0,00	0,04	0,04	-	-	R\$ 159,12	R\$ 12,79	
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 160,73	R\$ -	
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão	1,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Instrumento IV		2,25		3,25				R\$ 435,69	
TRC - CDR Casemirozina	Gestão de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	
	Administração (Compras e Contratações)	1,00	1,00	1,00	-	-	R\$ 160,73	R\$ -	
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Instrumento V		0,00		0,00				R\$ -	
TRC - COMETE Frestalva	Gestão de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
	Financeiro	0,22	0,14	0,46	-	-	R\$ 129,42	R\$ 94,53	
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
	Informática	0,00	0,04	0,04	-	-	R\$ 159,12	R\$ 6,48	
	Administração (Compras e Contratações)	1,00	1,23	2,23	-	-	R\$ 160,73	R\$ 376,50	
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Instrumento V		1,22		2,73				R\$ 447,51	
TRC - CDR Monitoramento Poço do Sít	Gestão de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ 160,52	
	Financeiro	0,75	0,33	1,08	-	-	R\$ 129,42	R\$ 137,19	
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
	Informática	2,00	0,10	0,10	-	-	R\$ 159,12	R\$ 25,01	
	Administração (Compras e Contratações)	1,25	1,54	2,79	-	-	R\$ 160,73	R\$ 473,55	
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25	1,87	1,62	-	-	R\$ 117,75	R\$ 190,76		
Supervisão	0,75	0,83	1,58	-	-	R\$ 286,42	R\$ 200,33		
Total equipe no período - Instrumento V		2,75		7,51				R\$ 1.399,24	

Agosto/2018

1 e Conduta - Tot.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrada entre SCA e FUNRIO em 01 de setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sobrecarga gerido no período de 01 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo II).

		Carência de recursos em execução no presente - 31/08/2018 (5 - milhões)										
		Estrutura de Atividades			Horas Realizadas	Tabela 1	Horas Realizadas + Resíduo	AR de pessoal no escopo em tempo parcial	Equivalente de equipe custada por mês	Valor honorários (em R\$)	R\$ Total Taxativo	
Instrumentos V - Inst. Termo de Ajustamento	TAC CTA - Apoio de Barra Mansa	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	-	
		Financeiro	3,52	1,34	3,00	-	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	473,66	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	-	
		Informática	0,00	0,35	0,35	-	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	55,04	
		Administração (Compras e Contratações)	7,75	9,93	17,30	-	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	2.936,33	
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-		
	Total equipe no período - Instrumento V	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 286,42	R\$ -	-	
	TAC CTA PE - Concessão de Obras	Gerenciamento de projetos	4,54	3,58	8,12	-	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	1.464,28	
		Financeiro	5,74	1,88	5,00	-	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	779,13	
		Jurídico	3,52	0,33	3,89	-	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	896,89	
		Informática	0,00	0,58	0,58	-	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	92,23	
		Administração (Compras e Contratações)	4,25	5,29	9,49	-	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	1.610,74	
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	2,74	2,74	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	321,51		
	Supervisão	2,00	2,00	4,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	471,51		
Total equipe no período - Instrumento V	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 286,42	R\$ -	5.184,44		
TAC CUCURON - Unidade - Residência de Mangaratiba	Gerenciamento de projetos	3,33	3,33	6,67	-	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	977,44		
	Financeiro	1,14	0,52	1,00	-	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	234,84		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	-		
	Informática	0,00	0,16	0,16	-	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	25,46		
	Administração (Compras e Contratações)	0,50	0,63	1,13	-	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	190,10		
Apoio Administrativo e Comunicação	2,00	0,00	2,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-			
Supervisão	0,10	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-			
Total equipe no período - Instrumento V	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 286,42	R\$ -	1.907,84		
TAC CUCURON - Unidade - Núcleo Básico de Mauá - Projeto de Reurbanização	Gerenciamento de projetos	18,18	15,11	34,29	-	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	4.189,46		
	Financeiro	7,15	1,24	10,33	-	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	1.344,67		
	Jurídico	2,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	-		
	Informática	0,00	1,00	1,00	-	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	159,12		
	Administração (Compras e Contratações)	3,00	5,70	8,70	-	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	1.457,35		
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-			
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-			
Total equipe no período - Instrumento V	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 286,42	R\$ -	6.974,60		
Instrumento VI - Inst. Conv. de Gestão Financeira	Gerenciamento de projetos	0,75	0,59	1,34	-	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	241,46		
	Financeiro	2,25	1,03	3,27	-	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	424,20		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	-		
	Informática	0,00	0,35	0,35	-	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	55,81		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	-		
Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-			
Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	-			
Total equipe no período - Instrumento VI	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 286,42	R\$ -	692,27		
Agosto/2018	Comunidade	Gerenciamento de projetos			441,50	3	1,92	R\$ 180,34	R\$ 63.234,62			
		Financeiro			305,50	9	3,49	R\$ 129,42	R\$ 47.492,42			
		Jurídico			99,15	3	0,62	R\$ 218,52	R\$ 21.032,55			
		Informática			24,00	1	0,13	R\$ 159,12	R\$ 1.918,89			
		Administração (Compras e Contratações)			250,00	20	1,90	R\$ 169,73	R\$ 59.405,51			
		Apoio Administrativo e Comunicação			96,75	7	0,33	R\$ 117,75	R\$ 4.682,25			
		Supervisão			17,25	4	0,18	R\$ 117,75	R\$ 2.142,74			
		Total equipe no período - Comunitário			1.244,25	37,64	6,83	R\$ 286,42	R\$ 206.111,32			
		Despesas Fixas Associadas ao Volume de Recursos em Execução										
		Vistos e tempo										R\$ 5.520,71
		Material de escritório e equipamentos										R\$ 4.262,37
		Despesas Adm. (energia, telefonia, gás, água, etc.)										R\$ 8.304,40
		Transporte										R\$ 2.085,74
		Total										R\$ 215.893,54
		Despesas Variáveis										
01 Chamada de Seleção de Projetos									R\$ 1.593,52	R\$ -		
02 Capacitação de Gestores									R\$ 3.005,74	R\$ -		
03 Plano de Comunicação									R\$ 1.596,02	R\$ -		
04 Assistência Técnica Monitoramento									R\$ 4.262,97	R\$ -		
Outras Despesas									R\$ -	R\$ -		
Comunicações ad hoc									R\$ -	R\$ -		
Total a receber										R\$ 223.393,04		

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SGA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de que reme-grão no período de 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018 de acordo com o plano de custos demonstrativo anexo ao acordo (Anexo 4).

Cenário de custos em execução no período - R\$ 15 mil (Cinco mil e 25 mil reais)

Tipologia de Atividade	Horas Realizadas	Índice ¹	Horas Contratadas Base	Nº de pessoas no campo e tempo parcial ²	Equivalente de Equipe dedicada por mês ³	Valor Mensal (R\$)	R\$ Total Realizado
------------------------	------------------	---------------------	------------------------	---	---	--------------------	---------------------

¹ As horas de campo (trabalho) se referem às horas de horas de campo no mês. O índice é o Quociente demonstrado no relatório de Timestracker somado das horas complementares quando necessárias para atingimento das horas mínimas por tipologia e taxa de execução constantes no Anexo 4 do Acordo de Cooperação (04/2016), horas estas que foram cobradas nos Instrumentos com horas lançadas respeitando suas respectivas tipologias e proporcionalidades.

² Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio sua dedicação parte do seu tempo à implementação do mecanismo e consequentemente fixação de horas nos respectivos instrumentos.

³ Equivalente de Equipe dedicada por mês - Trata-se do razão entre o nº de horas lançadas por tipologia sobre o nº de horas disponíveis no mês.

Obs: Para comparação dos valores referentes à execução de obra de execução foram utilizados o valor consolidado dos processos em compras autorizados ao acumulado executado no semestre.


Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período da execução: 01 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016

Cólicas



1	2	3	4	5	6
	Projetos Aprovados Alocados	Despesas efetuadas no âmbito do Convênio (00/01/2016)	Despesas efetuadas no período 01/08/2016 a 31/08/2016	Valor total executado	Valor total a executar
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental - SINUC	R\$ 195.687.362,90	R\$ 87.600.461,43	R\$ 2.462.439,78	R\$ 122.064.245,10	R\$ 74.623.117,50
II - Instrumento Operacional de Direção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 3.288.717,36	R\$ 1.650.096,69	R\$ 97.933,19	R\$ 2.817.545,74	R\$ 448.171,61
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ 14.226.059,08	R\$ -	R\$ 7.246.662,67	R\$ 6.150.690,86	R\$ 6.007.166,73
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 214.180.159,55	R\$ 89.250.548,12	R\$ 3.472.381,15	R\$ 133.040.681,69	R\$ 81.139.457,84

Obs: Os Instrumentos II, IV e VI não possuem projetos alocados até o período apresentado.



Administrativo da Alocacao de Recursos e Execucao dos Projetos
Resumo de execucao (pagamentos efetuados) no periodo por projeto
Acordo de Cooperacao N° 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensacao Ambiental SNUC
a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ
Periodo de execucao: 01 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016
Coluna

Empreendimento	TCCA	3	4	5	6	7	8	9	10
		Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CPF (Cadastro Fiscal Financeiro)	Execução Convênio 0032009	Despesas efetuadas no período 01/08/2016 a 31/08/2016	Despesas efetuadas no período 01/08/2016 a 31/08/2016	Valor total executado	Valor a receber	Status
CTR Ilhéova	01/2009	Ações Prioritárias de apoio à gestão de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 28.11.10.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	Em andamento
Quilô Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de vitórias - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.968,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.968,42	R\$ 8.568,36	Em andamento
Gruta Funda	08/2010	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Veículos para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGURADINEA 28.11.02.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Finalizado
Melo CRB	01/2010	Plano de manejo e implantação de Segmentos Prioritários de APA do Rio Guandu - PM e Implent. APA do Guandu 28.11.14.0001	R\$ 1.234.096,00	R\$ 6.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.024,00	R\$ 1.228.072,00	PC Final Solicitada
Melo CRB	01/2010	Sinalização do Parque Nacional da Tapuia, orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e inserimento na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tapuia Sinalização 28.11.14.0002	R\$ 708.720,33	R\$ 0,00	R\$ 38.128,15	R\$ 0,00	R\$ 38.128,15	R\$ 668.591,18	Em andamento
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de Imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos Curitiba - Aquisições para a sede 28.11.18.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 28.740,00	R\$ 0,00	R\$ 472.208,83	R\$ 100.992,48	Em andamento
Presidente Vargas CSM	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Condição - Aquisições PE Serra da Condição 28.11.32.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	Em andamento
TA AR Transpetrol	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e logar do Parque Estadual da Serra da Trilícia, Reserva Ecológica de Jussara e Reserva Extrativista Albatroz do Itaipó - Projeto para aquisição de embarcação 28.11.11.0001	R\$ 676.320,00	R\$ 903.631,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.389,44	Em andamento

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo da execução (juizamentos efetuados) no período por projeto.

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

1 - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

8) Carteira de Projetos Aproveitados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	ICCA		Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental da Estação do Rio da Janeiro - CCA	CPF (Cadastro Financeiro)	Execução Convênio	Despesas efetuadas no período 01/08/2016 a 31/07/2016	Despesas efetuadas no período 01/08/2016 a 31/07/2016	Valor total associado	Valor a executar	Status
TA/R Transporte	10/2011		Intervenções de Saneamento no Parque Esportivo da Ilha Grande - Estações de Arocatiba e Provides - PE Ilha Grande Geradoras 28.11.11.0002	R\$ 149.858,25	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 42.458,25	Em andamento
Ampliação Porto Sudoeste	08/2015		Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Veículos para o Serviço de Guarda Parques do INEA - Aquisições SEGRARINEA 28.11.22.0001	R\$ 580.858,56	R\$ 500.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	Finalizado
GNV Patrulhas	07/2015		Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Veículos para o Serviço de Guarda Parques do INEA - Aquisições SEGRARINEA 28.11.23.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Finalizado
CASDUC III	12/2008		Fortalecimento e Implantação do Sistema de Gestão do Uso Público para Incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 5.468.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.365,70	Em andamento
CSA 2	11/2007		Distribuição de Unidades de Conservação Municipais - Escola 1-25000 - Delimitação de Ucs Municipais -SEA	R\$ 4.439.007,00	R\$ 4.439.007,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.007,00	R\$ 26.343,00	Em andamento
CSA 2	11/2007		Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento p/Monte TCT Prof. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Suspensão - DOCs em Análise
CSA 2	11/2007		Projeto Revitalização do Soco e Fortalecimento da Estrutura do Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 28.11.01.0001	R\$ 2.532.770,81	R\$ 2.532.770,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.770,81	R\$ 161.411,45	Em andamento
CSA 2	11/2007		Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo Operacional localizados no Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.238.500,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.238.500,81	R\$ 16.586,94	Em andamento
CSA 2	11/2007		Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Ilha do Rio Miracó - APA do Rio Miracó 28.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.862.103,56	R\$ 2.862.103,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862.103,56	R\$ 125.260,11	Em andamento



Demonstrativo da Alocacao de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no periodo por projeto
Acordo de Cooperacao Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SAJUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Perfil de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Empreendimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	ICIA	Projeto aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	OFF (Orçamento Fiscal Financeiro)	Execução Convênio CCA/0009	Despesas efetuadas no periodo 02/08/2016 a 31/07/2018	Receitas efetivadas no periodo 01/08/2016 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subestação e adiantamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Relevo Praia do Sul	R\$ 1.006.194,51	R\$ 807.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42	Em andamento	
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal da Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003	R\$ 1.028.773,35	R\$ 259.512,25	R\$ 5.734,01	R\$ 0,00	R\$ 269.246,26	R\$ 1.329.527,09	PC Parcial Entada	
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	R\$ 604.300,00	R\$ 87.103,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 417.287,16	Suspensão - DOCS em Analise	
CSA 2	11/2007	Montagem Projeto de parceria Pública Privada (o Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação e conservação, e geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Montagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 47.980,64	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14	PC Final Solicitado	
Campes Puro	03/2010	Ações Prioritárias para a implementação do Parque Estadual Costa do Sol - Apds Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 5.608.576,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 656.825,08	PC Final Solicitado	
Campes Puro	03/2010	Obras para implementação da infraestrutura física do Sítio do Parque Estadual da Serra da Comendá Valença - Obras Infra. PE Comendá 29.11.03.0002	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.358,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.358,96	R\$ 111.461,31	Em andamento	
Campes Puro	03/2010	Consolidação do Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.352.706,71	R\$ 3.000.169,80	R\$ 1.225.309,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.679,10	R\$ 127.121,61	Em andamento	
Campes Puro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Aquilinos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2º fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,50	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00	Finalizado	



Demonstrativo da Atribuição de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 14/2016

1 - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

8) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	ECCA		Projeto aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Chf (Cronograma Físico Financeiro)	Execução Convênios 005/2020	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/07/2018	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/07/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Comopj Petro	03/2010		Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Condiúda - Obras para Implantação do Novo Acesso e Caminho na Sada e Aquisição de Matéria: Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Condiúda - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 5.242.054,35	R\$ 141.779,85	R\$ 4.545.504,06	R\$ 321.240,15	R\$ 4.608.023,06	R\$ 633.330,49	Em andamento
Comopj Petro	03/2010		Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007	R\$ 1.167.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 145.686,81	R\$ 6.154,88	R\$ 1.386.058,79	R\$ 11.430,21	Em andamento
Comopj Petro	03/2010		Obras Civas Destinadas à Implantação da Infraestrutura dos Trilhos e Atrelados do Parque Estadual da Serra de Trilhos - PE Serra de Trilhos - Obras para Implantação de Trilhos 29.11.03.0006	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14	Em andamento
Comopj Petro	03/2010		Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate às Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008	R\$ 1.622.050,00	R\$ 712.200,00	R\$ 779.070,00	R\$ 43.245,00	R\$ 1.034.615,00	R\$ 67.545,00	Em andamento
Comopj Petro	03/2010		Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009	R\$ 9.508.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 7.266.832,26	R\$ 6.631,47	R\$ 8.023.594,50	R\$ 1.574.577,52	Em andamento
Comopj Petro	03/2010		Reabilitação do Trecho Inicial do Rio Caricó e Restauração das Reservas de Mito D'água - PARN Tijuca Rio Caricó 29.11.03.0011	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 630.796,84	R\$ 15.607,56	R\$ 646.404,36	R\$ 28.595,84	Em andamento
Porto do Açú LLX	12/2009		Projeto Executivo para Implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 80.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 10.000,00	Em andamento
Porto do Açú LLX	12/2009		Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual do Guemilúda - Obras Implant. Sede EEE Guemilúda	R\$ 3.371.054,62	R\$ 3.256.404,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.256.404,17	R\$ 72.650,43	Em andamento



Demonstrativo da Alocacao de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016

1 - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ


Período da execução: 01 de Agosto de 2016 a 31 de Agosto de 2016

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TECA		Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	OTF (Orçamento Fiscal - financeiro)	Execução Compilada 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/08/2016 a 31/07/2016	Despesas efetuadas no período 01/08/2016 a 31/08/2016	Valor total contratado	Valor a receber	Status
Ponto do Agu LIX	12/2009		Projeto de Implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Verenaia - RJ - RVS Ventania	R\$ 497.508,00	R\$ 156.749,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.749,37	R\$ 338.708,63	PC Final Enviada
Ponto do Agu LIX	12/2009		Licitação do Serviço de Regularização Fundiária (SIRF) MURF - Fase 3 - SERF 3 (MURF 3) 28.11.04.0002	R\$ 2.157.842,20	R\$ 2.107.602,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.802,28	R\$ 0,00	Finalizado
Ponto do Agu LIX	12/2009		Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresas para conservação e reforma de estruturas - UPAs PIERJ 28.11.04.0003	R\$ 3.351.070,00	R\$ 527.378,92	R\$ 75.850,00	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 2.747.726,02	Em andamento
Ponto do Agu LIX	12/2009		Programa de Implantação e Fortalecimento APA Proteção de Colônia de Niterói - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Proteção de Colônia	R\$ 368.446,00	R\$ 97.650,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.650,82	R\$ 270.795,18	Suspensão - DOCs em Análise
Ponto do Agu LIX	12/2009		Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - PROUC - Criação UCs Municipais - 28.11.04.0007	R\$ 3.568.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568.000,00	Em andamento
Impl Urb Compens	08/2012		Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Seabra - Ações Implant. PE Pedra Seabra 28.11.08.0001	R\$ 1.054.487,88	R\$ 1.070.593,72	R\$ 136.974,33	R\$ 0,00	R\$ 1.207.568,05	R\$ 456.913,81	Em andamento
Impl Urb Compens	08/2012		Fortalecimento de Projetos Executivos de Implantação de Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Trindade - Projeto Executivo PE Serra da Trindade 28.11.08.0002	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Em andamento
Impl Urb Compens	08/2012		Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Pesquisa e Caimom do Parque Estadual da Piedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Piedra Branca 28.11.08.0003	R\$ 950.000,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09	Em andamento



Demonstrativo da Alocação do Recursos e Execução dos Projetos
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016
 1 - Instrumento Operacional de Cooperação Ambiental SNUC
 a) Carteira de Projetos Aprovados CCMRJ
 Período da execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TECA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFR (Contingência Financeira)	Execuções Carreadas (0050009)	Despesas emendadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor total acordado	Valor a receber	Status
Inpl. Uta Comple	08/2012	Projeto aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA 29.11.08.0004	R\$ 3.852.839,58	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.166.987,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 530.404,98	PC Final Solicitada
Inpl Uta Comple	05/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPPP) - Fase IV - RPPM Uta INEA 29.11.08.0005	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.640,50	R\$ 1.380.108,05	R\$ 431.709,85	R\$ 2.284.409,50	R\$ 293.282,88	Em andamento
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Curimbocho - Obras Infra PE Curitibauba	R\$ 4.280.800,29	R\$ 4.280.800,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.800,29	R\$ 0,00	Em andamento
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biotó do Banco de Dados Espaciais Módulo 3 - Implantação Componente Biotó BUE 29.11.08.0001	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 99.853,00	R\$ 60.828,50	R\$ 189.510,00	R\$ 5.115,00	Em andamento
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com recobertura e introdução de espécies ameaçadas do Rio de Janeiro depositadas no CETASIRJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - CETAS (Flora) - Aquisição de Suprimentos 29.11.08.0002	R\$ 344.583,94	R\$ 175.277,83	R\$ 152.133,81	R\$ 8.010,65	R\$ 336.022,39	R\$ 0.541,05	Em andamento
Construção Naval do Açu	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Dendragano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Dendragano 2ª Fase 29.11.08.0001	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.301.105,88	R\$ 308.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 350.793,67	Em andamento
Construção Naval do Açu	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município do Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Uta do S. Ant. de Pádua 29.11.08.0005	R\$ 689.276,20	R\$ 142.108,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.108,56	R\$ 547.079,64	Suspensa - DOCS em Análise
Construção Naval do Açu	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual de Leões do Açu - Ações Implanz. PE Leões do Açu 29.11.08.0002	R\$ 1.934.367,00	R\$ 510.547,49	R\$ 173,00	R\$ 0,00	R\$ 910.720,55	R\$ 1.423.646,45	Em andamento
Construção Naval do Açu	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Emissões de Arqueação e Projeto - PE Ilha Grande Geradores 29.11.08.0003	R\$ 2.454.004,16	R\$ 0,00	R\$ 1.042.699,60	R\$ 49.348,42	R\$ 1.692.045,07	R\$ 761.959,09	Em andamento



Administrativo de Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período, por projeto
 Acordo de Cooperação Nº 04/2018
 I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
 a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCOA	Projeto aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF (Orçamento Fiscal Financeiro)	Lançamento Convênio	Decisões efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Situação
Construção Naval do Aquecimento	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004	R\$ 7.437.231,70	R\$ 0,00	R\$ 3.231.041,71	R\$ 362.371,80	R\$ 3.613.413,51	R\$ 3.823.815,19	Em andamento
Construção Naval do Aquecimento	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs EBRJ 29.11.05.0007	R\$ 9.095.464,60	R\$ 0,00	R\$ 5.863.426,79	R\$ 904.737,96	R\$ 6.768.164,77	R\$ 2.327.300,03	Em andamento
Construção Naval do Aquecimento	05/2011	Análises e Estudos para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0005	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 836.845,70	R\$ 0,00	R\$ 836.845,70	R\$ 17.119,30	Em andamento
Terminal Marítimo Ilha de Guaiabal	12/2012	Modelagem Final de parcelas Públicas Privadas do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação a conservação, a gestão de recursos e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Final PPP 29.11.02.0001	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 44.935,07	R\$ 0,00	R\$ 44.935,07	R\$ 18.297,97	PC Final Solicitada
Terminal Marítimo Ilha de Guaiabal	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Emissões de Arqueação e Provisão - PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002	R\$ 16.632,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.632,19	Em andamento
Igualitar CSN I	15/2012	Implantação de Sede do Parque Estadual do Pádua Selada - Implantação PE Pádua Selada 29.11.13.0001	R\$ 1.950.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07	Em andamento
Igualitar CSN I	15/2012	Melhoria de Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002	R\$ 389.258,14	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 0,00	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79	Em andamento
Mem CSN I	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação de Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001	R\$ 1.798.000,00	R\$ 369.811,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.811,00	R\$ 1.398.389,00	PC Final Solicitada



Demonstrativo da Alocacao de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período, por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016

1 - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SMUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CVF (Orçamento Financeiro)	Execução Convênio 003/2008	Despesas efetuadas no período 02/08/2016 a 31/07/2018	Disponibilidades no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAM	R\$ 285.600,00	R\$ 285.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.600,00	R\$ 0,00	Finalizado
CTR SEF6	02/2010	Modelagem Piloto de parcela Pública Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação e conservação, a geração de empregos e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 25.11.17.0001	R\$ 376.734,19	R\$ 292.167,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282.161,70	R\$ 84.032,49	PC Final Solicitada
Mant. Imperial	16/2013	Modelagem Piloto de parcela Pública Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação e conservação, a geração de empregos e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 25.11.19.0001	R\$ 85.381,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.381,50	PC Final Solicitada
Quilumb.	04/2012	Modelagem Piloto de parcela Pública Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação e conservação, a geração de empregos e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 25.11.07.0001	R\$ 520.978,73	R\$ 340.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73	PC Final Solicitada
Ampliação CTR Sany	02/2011	Modelagem Piloto de parcela Pública Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação e conservação, a geração de empregos e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 25.11.18.0001	R\$ 70.240,09	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.240,09	PC Final Solicitada
UTE Santa Cruz	06/2014	Modelagem Piloto de parcela Pública Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação e conservação, a geração de empregos e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 25.11.20.0001	R\$ 1.100.199,01	R\$ 514.478,91	R\$ 4.972,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 690.749,06	PC Final Solicitada
LUPOM Compuj	14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nos UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 25.11.24.0001	R\$ 1.569.612,32	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	PC Final Encerrada



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aproveitados (CCARJ)

Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCOA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CDF (Comprovações Financeiras)	Executado Convênio 0032009	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	
Sistema Autoviação Competi	07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II - 28.11.21.0002	R\$ 1.735.273,00	R\$ 487.028,00	R\$ 1.120.084,32	R\$ 1.634.833,22	R\$ 100.419,78	Em andamento	
	Sem TCOA	Projeto de Fortalecimento Institucional para o apoio técnico às Unidades de Conservação, na prevenção a incêndios florestais, aos crimes e fiscalizações ambientais - Apoio técnico às Ucs - 28.11.26.0001	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00	Em andamento	
	Sem TCOA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Vigias - Fort. Operacional UCs - Vigias - 28.11.26.0008	R\$ 6.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600.000,00	Em andamento	
	Sem TCOA	Identificação e regularização ambiental das áreas rurais localizadas no interior da zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais - CAR nas Ucs - 28.11.26.0007	R\$ 4.857.153,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.857.153,33	Em andamento	
	Sem TCOA	Incremento do Gestão de Visitação e da Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Incremento da gestão da visitação nas Ucs - 28.11.26.0003	R\$ 2.345.380,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.345.380,05	Em andamento	
	Sem TCOA	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - Projeto RPPN V - 28.11.26.0005	R\$ 3.671.338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.671.338,00	Em andamento	
	Sem TCOA	Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Projeto SERP V - 28.11.26.0004	R\$ 3.258.826,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.258.826,27	Em andamento	
	Sem TCOA	Implementação da Rede Estadual de Corredor de Restauração de Áreas Silvestres - CRAS nas Unidades de Conservação Estaduais - Projeto CRAS - 28.11.26.0007	R\$ 2.685.719,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.685.719,55	Em andamento	
	Sem TCOA	Planos Municipais da Mata Atlântica nas Regiões do Médio Paraíba e Serrana - Planos Municipais - Reg. Serrana e M. Paraíba - 28.11.26.0006	R\$ 4.556.532,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.556.532,34	Em andamento	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016
 I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SINUC
 a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ
 Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018.

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCOA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Off (Cronograma Físico Financeiro)	Execução Correlata 003/2018	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Síntese		
	Sem TCOA	Desapropriação da Área Inerida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza - Desapropriação da Área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - R\$ 11.35.0008	R\$ 601.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601.704,00	Em andamento		
Total - Valores alocados até 31 de Agosto de 2018										
			R\$ 164.112.730,29	R\$ 60.296.211,54	R\$ 31.952.022,77	R\$ 2.206.566,63	R\$ 94.603.800,84	R\$ 69.608.919,45		

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016
 I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SINUC
 a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ
 Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018.

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCOA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Off (Cronograma Físico Financeiro)	Execução Correlata 003/2018	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018		
	Sem TCOA	Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos - O projeto foi executado conforme Ofício SEASAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,66 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ					
		SERF (MUREF) Fase 3 - O projeto foi executado conforme Ofício SEASAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ					
		Uniformes camuflados do CPAm - O projeto foi executado conforme Ofício SEASAP 330/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ					
		Aquisições SEGP/INEA - O projeto foi executado conforme Ofício SEASAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.790.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ					
		Estim. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ - O Ofício SEASAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 escalou um edêno de valor no valor de R\$ 57.050,00 passando seu valor total de 1.595.000,00 para R\$ 5.181.704,00					

Modificação PNUC PPP - O Ofício SEASAP nº 111/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o coeficiente de valor de R\$ 322.620,00, sendo adotados os incluídos os respectivos valores e TCOAs, UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74, Ampliação CTL Saly Sazon acréscimo de R\$ 8.738,80; Dúctimo acréscimo de 88.398,47; Minha primeira academia de R\$ 14.249,93; CTR SERE acréscimo de R\$ 29.701,40; CSA 7 incluído no valor de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,20; CETAS (PNUC) - Aquisição de Suprimentos - O Ofício SEASAP nº 168/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor do projeto de R\$ 25.789,20, sendo adotado o valor do projeto de R\$ 211.051,29 para R\$ 236.840,49. O projeto teve um novo aditivo através do Ofício SEASAP 201/2016, de 05 de junho de 2017, estabelecendo um novo acréscimo no projeto no valor de R\$ 105.904,55 passando o valor total do projeto para R\$ 342.744,95.

Comemoração da Flora Endêmica Ameaçada Fase II - O Ofício SEASAP nº 202/17, de 25 de janeiro de 2017, estabeleceu o coeficiente de valor do projeto de R\$ 317.620,00 para R\$ 1.641.025,00. Nesse mesmo mês para o projeto, anexado ao TCOA nº 202/17 (Constituição Naval do Agri), conforme Ofício SEASAP 314/2017 de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo no projeto no valor de R\$ 1.041.225,00 para R\$ 2.682.250,00. O Ofício SEASAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 escalou um acréscimo no projeto no valor de R\$ 94.248,30 passando o valor total do projeto para R\$ 2.776.498,30.

Comissão Gestora do Uso Público UC's RJ - O Ofício SEASAP nº 159/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o coeficiente de valor do projeto de R\$ 52.221,20, sendo adotado o valor do projeto de R\$ 4.352.706,71.

PARMA Tijuca Rio Carioca - Contrato Ofício SEASAP nº 225 e 228, de 26 de junho de 2017, foi solicitada a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do PMA (DGO - Instituto do Desenvolvimento e Cidadão), solucionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência assim realizada em 01/08/2017. Agendamento Ofício que autoriza e DGO a executar o projeto.

PE Ilha Grande Olivares - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.204,00 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados mediante assim um valor de R\$ 483.418,33 alocou a ser utilizado pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado de seguinte forma: R\$ 133.236,00 no TCOA 10/2011 (CAAR Tratado), R\$ 342.954,87 no TCOA 09/2011 (Constituição Naval do Agri) e R\$ 12.227,80 no TCOA 12/2017 (Termo de Referência do Gubão).

Fortalecimento Operacional UCs ERJ - O Ofício SEASAP nº 300/0017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor do projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo adotado o valor do projeto e alocado no TCOA 02/2011 (Constituição Naval do Agri). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.095.464,80 para R\$ 19.690.636,62.

PE Serra da Condição - Obras e Aquisições - 2ª Fase - O Ofício SEASAP nº 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através do Ofício INEAD/BAPE nº 19/2017, estabeleceu o acréscimo de valor do projeto de R\$ 651.704,06, sendo adotado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.181.704,06.

SERF Ucs INEA - Conforme o Ofício SEASAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEAD/BAPE nº 46/2018, estabeleceu o acréscimo de valor do projeto de R\$ 420.740,54, sendo adotado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 3.862.839,98 para R\$ 4.283.580,52.

PE Curitiba - Obras Estrada RJ 149 - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEAD/BAPE nº 103/2018, em 07 de agosto de 10/04/2018.

RB Guaratiba Obras da Sede - O projeto no valor de R\$ 3.436.904,58 foi cancelado conforme Ofício INEAD/BAPE nº 103/2018, em 07 de agosto de 10/04/2018.

Apoio Técnico Infraestrutura UCs - Conforme o Ofício SEASAP nº 218/2018 datado em 09/04/2018, através do Ofício INEAD/BAPE nº 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor do projeto de R\$ 1.297.348,09 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ.

Fortalecimento do Parque Esportivo Ucs - O projeto foi desativado conforme Ofício SEASAP nº 331/2018 de 11/07/2018, restando seu valor comprometido de R\$ 5.234.205,06 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ.

Proibição do Parque - TCT INEA Abril 2018 - O projeto foi desativado conforme Ofício SEASAP nº 331/2018 de 11/07/2018, restando seu valor comprometido de R\$ 5.234.205,06 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ.

Edifício e Uso Público PNM Paripollá (TCT Município Paripollá mlierH4) - O projeto foi desativado conforme Ofício SEASAP nº 331/2018 de 11/07/2018, restando seu valor comprometido de R\$ 1.297.348,09 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ.

Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Inglá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014) - O projeto foi desativado conforme Ofício SEASAP nº 331/2018 de 11/07/2018, restando seu valor comprometido de R\$ 988.500,00 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ.

Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SINAC Julho/14) - O projeto foi desativado conforme Ofício SEASAP nº 331/2018 de 11/07/2018, restando seu valor comprometido de R\$ 453.000,00 para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ.

Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estadual - 2ª Fase - O projeto foi executado conforme deliberação 71 SEASAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016
 I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SINUC
 a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ
 Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018.

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016
 I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SINUC
 a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ
 Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018.



Demonstrativo de Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
4) Carta de Projetos Aprovados CCA/RJ
Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018
Coluna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFR (Programa Fluxo Financeiro)	Executado Completo (01/01/2018 a 31/08/2018)	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/07/2018	Despesas efetuadas no período 01/09/2018 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status

Demonstrativo de Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC
c) Reserva de Regularização Fundiária
Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018
Coluna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFR (Programa Fluxo Financeiro)	Executado Completo (01/01/2018 a 31/08/2018)	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 31/07/2018	Despesas efetuadas no período 01/09/2018 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Outros TELAR	08/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.844.744,36	R\$ 30.520,01	R\$ 19.735,83	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	Em Andamento
C5A 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.220,89	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00	Em Andamento
Comperj Pista	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 9.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.071.790,13	R\$ 4.028.219,87	Em Andamento
Construção Naval do Aqu	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.04.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.627.884,20	R\$ 0,00	R\$ 186.137,62	R\$ 4.074.021,82	R\$ 985.978,18	Em Andamento
Total - Valores alocados até 31 de Agosto de 2018			R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.249,89	R\$ 49.324,12	R\$ 205.873,25	R\$ 27.560.444,26	R\$ 5.014.198,05	





Demonstrativo de Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
Acordo de Cooperação Nº 04/2016


III - Instrumento Financeiro Fiduciário

Período da execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

1	2	3	4	5	6	7
Coluna		Despesas efetuadas no período 02/05/2016 a 31/07/2018	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CPF (Cronograma Físico Financeiro)	Execução Convênio 003/2009				
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Unidades de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) 28.30.02.0001	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.089.525,86	R\$ 97.933,19	R\$ 2.817.545,74	R\$ 449.171,61	Em andamento
Total - Valores alocados até 31 de Agosto de 2018	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.089.525,86	R\$ 97.933,19	R\$ 2.817.545,74	R\$ 449.171,61	

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
 Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto
 Acordo de Cooperação nº 04/2016

V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
 Período de execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018
 Coluna 1



2	3	4	5	6	7	8
Projeto	Execução Convênio 003/2006	Despesas efetuadas no período 02/08/2018 a 31/07/2018	Despesas efetuadas no período 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor 31/08 executado	Valor a executar	Status
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 0,00	R\$ 647.010,00	R\$ 53.900,00	R\$ 700.910,00	R\$ 1.100.460,76	Em andamento
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00	Em andamento
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005	R\$ 0,00	R\$ 874.775,00	R\$ 658.108,18	R\$ 1.532.883,18	R\$ 1.313.817,50	Em andamento
Total - Valores alocados até 31 de Agosto de 2018	R\$ 0,00	R\$ 7.245.882,67	R\$ 812.008,18	R\$ 8.168.890,85	R\$ 6.067.168,73	

ETE Pentágua - O Ofício SEASAP 154/2017, de 02 de Maio de 2017, estabeleceu o arcabouço de valor ao projeto de R\$ 540.283,38, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,66 para R\$ 2.264.028,32
 ETE Pentágua - O Ofício SEASAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o arcabouço de valor ao projeto de R\$ 551.078,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.028,32 para R\$ 2.815.102,48
 ETE Conservatória - Projeto com prestação de contas final aprovada conforme Ofício SEASAP 31/2018 e Ofício INEAD/DIRAM 33/2018 e encerrado no CONDOR conforme ata nº 370, visando um saldo de R\$ 615,63 que se encontra disponível.

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Resumo de Reembolso Funbio no período

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período da execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018



1	2	3	4	5	6
Coluna	C/C	Reembolsos Recebidos no período de 02/09/2016 a 31/07/2018	Reembolsos Recebidos no período de 01/08/2018 a 31/08/2018	Valor total Recebido	Valor total a Receber
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SINJIC					
I - (a) - Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ - 3000-7	3000-7	R\$ 2.807.860,07	R\$ -	R\$ 2.807.860,07	R\$ -
I - (b) Carteira de Compensação Ambiental Federal - 3001-5	3001-5	R\$ 2.786.818,67	R\$ -	R\$ 2.786.818,67	R\$ -
I - (c) Reserva de Regularização Fundiária - 3002-3	3002-3	R\$ 11.041,40	R\$ -	R\$ 11.041,40	R\$ -
II - Instrumento Operacional de Dicação					
3003-1	3003-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fundiário					
3005-9	3005-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal					
3008-2	3008-2	R\$ 21.884,03	R\$ 21.884,03	R\$ 21.884,03	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Regularização Termo de Ajustamento de Conduta - TAC					
3009-0	3009-0	R\$ 625.606,97	R\$ 625.606,97	R\$ 625.606,97	R\$ -
	TAC CSN				
	TAC Chevron - PMN Barão de Mauá	R\$ 357.403,89	R\$ 357.403,89	R\$ 357.403,89	R\$ -
	TAC Chevron - Recuperação Manguezal Tubacangas	R\$ 151.098,87	R\$ 151.098,87	R\$ 151.098,87	R\$ -
VI - Instrumento Operacional de Outros Fontes					
3010-4	3010-4	R\$ 117.104,21	R\$ 117.104,21	R\$ 117.104,21	R\$ -
	28.249,41	R\$ 28.249,41	R\$ 28.249,41	R\$ 28.249,41	R\$ -
Total Geral	R\$ -	R\$ 3.484.580,48	R\$ 3.484.580,48	R\$ 3.484.580,48	R\$ -

Obs: Para apuração são considerados os gastos nos instrumentos I (a), I (c) e III como a receber na carteira de Compensação Ambiental CCA Inst I (a), além dos gastos com despesas fixas e variáveis

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ

Consolidado de Processos em Compras

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período data base 30/08/2018



Secretaria
do Ambiente

1	2	3	4	5
Instrumento	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 20.162.719,37	R\$ 502.777,93	R\$ 6.603.439,97	R\$ 27.268.937,27
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.835.755,07	R\$ 5.835.755,07
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 20.162.719,37	R\$ 502.777,93	R\$ 12.439.195,04	R\$ 33.104.692,34



Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Acordo de Cooperação N° 043316

Posição dos processos em Compras na data de 30/04/2016

1) PRÉVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projeto	Dependências	Nº processos	Método	Valor CFP (R\$)
Acordo FMA - Ação Integral - RI Lagoa do Açu	Acordo FMA - Constituição Baseado Aço (2002/2002-7)	24	Shopping	R\$ 83.120,76
Acordo FMA - Projeto AMB do Rio Macaé	Acordo FMA - CRO2 (Tijaret) 2002-7	16	Shopping	R\$ 62.682,20
Acordo FMA - Projeto Parque Ambiental do Sincangara	Acordo FMA - CRO2 (Tijaret) 2002-7	62	Shopping	R\$ 120.000,00
Acordo FMA - Projeto Oliva e Fertilizamento P&S	Acordo FMA - CRO2 (Tijaret) 2002-7	2	Shopping	R\$ 12.100,00
Acordo FMA - PE Contabilização - Ação para a loja	Acordo FMA - POB Paralelo (Lugar) 2002-7	26	Shopping	R\$ 26.900,00
Acordo FMA - Obras Iniciais - Sede SRF Quadrilha	Acordo FMA - Porto do Açu (Lugar) 2002-7	4	Shopping	R\$ 61.612,00
Acordo FMA Ação sobre a UCA	Acordo FMA - Inv / 06 - Defesa CIAMU - 2002-7	1	Shopping	R\$ 1.442.000,00
Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Parque Estadual Uca - Vigas	Acordo FMA - COMPROJ (Tijaret) 2002-7	1	Shopping	R\$ 3.762,74
Acordo FMA - Invenção de gestão de visitação na UCA	Item Invenção de TCCA	1	Shopping	R\$ 1.000.000,00
Acordo FMA C&A na UCA	Serviço de obra de TCCA	1	Shopping	R\$ 7.618.432,32
Acordo FMA - P&A - Criação UCA Mar de São	Serviço de obra de TCCA	1	Shopping	R\$ 4.847.153,32
Acordo FMA - SRF - F&B V		2	Shopping	R\$ 2.002.002,32
Acordo FMA - SRF - F&B IV		2	Shopping	R\$ 6.102.428,62
Total		174		R\$ 32.641.185,20

RESUMO

Método	Qtz. Processos	Valor Total CFP por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / Efetivo	Tempo médio real em compras
Shopping	169	R\$ 15.229.590,24	R\$ 89.522,21	30 dias	165 dias
Outro	5	R\$ 4.007.153,32	R\$ 801.430,66	60 dias	265 dias
Total	174	R\$ 20.162.718,20			

2) COMPROMETIDO: Pedido de Compra fechada e anexos de entrega / pagamento

Projeto	Nº processos	Valor	Valor (R\$)
Acordo FMA - Fertilizamento Operacional UCA SRF	2	Shopping	R\$ 500.777,05
Acordo FMA - Projeto AMB do Rio Macaé	2	Shopping	R\$ 75.170,22
Total	4		R\$ 575.947,27

RESUMO

Método	Qtz. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	4	R\$ 575.947,27	R\$ 143.986,82
Total	4	R\$ 575.947,27	

3) COMPROMETIDO: Contrato em andamento

Projeto	Última Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Prazo Máximo Contrato
Acordo FMA PE Serra da Cantareira - Obras e ass. legal - 2ª Fase	14/06/2014	R\$ 4.453.744,52	R\$ 0,00	2	60/15
Acordo FMA Fertilizamento Operacional UCA SRF	12/02/2016	R\$ 1.020.217,03	R\$ 640.666,21	1	30/15
Acordo FMA Fertilizamento Operacional UCA SRF	01/09/2016	R\$ 3.810.227,26	R\$ 467.016,00	1	60/15
Acordo FMA - P&A/M&A Tjara - Rio Cordeiro	23/11/2015	R\$ 646.404,18	R\$ 0,00	1	60/15
Acordo FMA PE - Invenção - Cantareira	22/05/2016	R\$ 1.177.152,25	R\$ 50.200,15	2	30/15
Acordo FMA C&A (P&A) - Assinatura de Suplemento	04/10/2016	R\$ 282.040,86	R\$ 9.788,88	3	30/15
Acordo FMA SRF - UCA SRA	20/06/2016	R\$ 2.985.220,27	R\$ 0,00	0	30/15
Acordo FMA - Ação Integral - Cantareira Uca	06/05/2017	R\$ 7.437.121,48	R\$ 5.620.717,02	0	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 47.380,64	R\$ 24.530,14	4	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 24.242,68	R\$ 24.242,68	2	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 25.224,18	R\$ 25.224,18	1	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 48.288,32	R\$ 48.288,32	1	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 45.831,50	R\$ 45.831,50	2	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 283.478,73	R\$ 283.478,73	10	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 62.123,04	R\$ 18.387,67	3	30/15
Acordo FMA - Projeto Plano SRF no P&S	11/12/2015	R\$ 48.371,11	R\$ 4.873,24	2	30/15
Acordo FMA - Instalação Condensador Hava SRF	11/02/2015	R\$ 907.264,00	R\$ 207.260,96	13	30/15
Acordo FMA - Instalação Condensador Hava SRF	03/11/2015	R\$ 119.881,52	R\$ 0,00	2	30/15
Acordo FMA - Instalação da Rede Endêmica - F&B I	14/10/2015	R\$ 1.613.219,52	R\$ 0,00	2	30/15
Acordo FMA Projeto para Contrate ass. Invenção na UCA SRF	25/07/2017	R\$ 630.830,30	R\$ 12.465,16	1	30/15
Acordo FMA Projeto para Contrate ass. Invenção na UCA SRF	25/06/2016	R\$ 57.083,02	R\$ 57.083,02	1	30/15
Acordo FMA Projeto para Contrate ass. Invenção na UCA SRF	20/12/2017	R\$ 264.104,55	R\$ 215.065,21	2	30/15
Acordo FMA Fertilizamento Operacional UCA SRF	06/08/2014	R\$ 243.863,20	R\$ 243.863,20	1	30/15
Total		R\$ 28.379.642,18	R\$ 6.633.432,67		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Previsão em Compras em 31/03/2016	R\$
Roborização de Compras	R\$ 30.162.718,27
Pedidos de Compra fechados	R\$ 575.947,27
Contratos em andamento (a pagar)	R\$ 6.633.432,67
Valor Total	R\$ 37.372.103,21



Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ

V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Acordo de Cooperação N° 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 30/08/2018

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	N° processos	Método	Valor CFF (R\$)	C.Custo
Total		0		R\$ 0,00	

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Total	0	R\$ 0,00			

2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	N° processos	Método	Valor (R\$)
Total	0		R\$ 0,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping/Direta	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	0	R\$ 0,00	

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	N° parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Acordo FMA - TAC CSN - ETE Perifagna	30/04/2017	R\$ 2.815.102,47	R\$ 97.512,00	3	ago/18
Acordo FMA TAC Chevron - Recuperação de Manguezal - Tubiacan	15/05/2017	R\$ 2.500.588,50	R\$ 1.250.294,25	10	mai/19
Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul	31/08/2017	R\$ 1.725.380,00	R\$ 1.024.450,00	14	ago/19
Acordo FMA - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras	12/03/2018	R\$ 2.891.298,19	R\$ 1.158.415,01	4	dez/18
Acordo FMA - TAC CSN - Águas de Barra Mansa	14/03/2018	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	19	set/22
Acordo FMA TAC Chevron - PMN Barão de Mauá	21/06/2017	R\$ 1.750.000,00	R\$ 805.083,81	3	jul/19
Total		R\$ 13.482.349,16	R\$ 5.835.755,07		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/05/2018	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento (A pagar)	R\$ 5.835.755,07
Valor Total	R\$ 5.835.755,07

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro/RJ
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de Operações de Projetos de 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repassar ao FIM/UF-Início	*Saldo transferido para o IDG (em Agosto de 2018)	Entrada de Recursos Agosto/2018	Rendimento - Tarifas Agosto de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Agosto de 2018
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC					
II - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA					
Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	R\$ 347.254,80	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Japeri Rod. GAS JAP - TCCA (13/2007)	R\$ 869.146,00	R\$ -	R\$ -		
Ponte da Av. Mac Loren - TCCA (03/2009)	R\$ 1.002.207,82	R\$ -	R\$ -		
Via Pinheiro de Assaio COM/ERJ - TCCA (01/2013)	R\$ 8.156.153,87	R\$ -	R\$ -		
Aeroporto Vito Ruzicka - TCCA (06/2010)	R\$ 1.093.118,72	R\$ -	R\$ -		
Alipheio São José - TCCA (04/2014)	R\$ 252.570,03	R\$ -	R\$ -		
CCR Duha - TCCA (05/2013)	R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ -		
Comport Ufesa - TCCA (10/2012)	R\$ 1.620.355,77	R\$ -	R\$ -		
Expansão Belta Vales - TCCA (05/2015)	R\$ 1.415.052,50	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim - TCCA (05/2013)	R\$ 248.900,72	R\$ -	R\$ -		
Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	R\$ 362.655,55	R\$ -	R\$ -		
Libra Teomir - TCCA (01/2012)	R\$ 514.870,70	R\$ -	R\$ -		
Linhas de Transmissão TCCA (05/2013)	R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ -		
Lote Buzios Golf (Agre) - TCCA (13/2013)	R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ -		
LT Mucal Campos III Furnas - TCCA (06/2014)	R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ -		
Mulica - TCCA (04/2013)	R\$ 188.889,04	R\$ -	R\$ -		
PCH Rita Provo - TCCA (07/2014)	R\$ 296.772,80	R\$ -	R\$ -		
Rua Leopoldo Teófilo - TCCA (08/2014)	R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ -		
Terminal S.J. ILL - TCCA (11/2012)	R\$ 370.029,27	R\$ -	R\$ -		
Terminal Submarina Embratel Comp. TCCA (02/2015)	R\$ 1.740.232,51	R\$ -	R\$ -		
UTE Porto do Agu - TCCA (12/2008)	R\$ 15.850.873,29	R\$ -	R\$ -		
CTR Itaberaí - TCCA (11/2009)	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ -		
Geosão III TAG - TCCA (12/2008)	R\$ 508.308,57	R\$ -	R\$ -		
Gruta Furca Transmissão (FMSJ) - TCCA (08/2010)	R\$ 119.669,82	R\$ -	R\$ -		
Milim CRB - TCCA (07/2010)	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ -		
PCH Paqueta Light - TCCA (28/2008)	R\$ 2.746.851,12	R\$ -	R\$ -		
Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	R\$ 1.772.587,00	R\$ -	R\$ -		
TAAR Transposição - TCCA (10/2011)	R\$ 620.082,57	R\$ -	R\$ -		
Ampliação Ponta Subsaia - TCCA (05/2015)	R\$ 518.000,00	R\$ -	R\$ -		
Ampliação CTR Safety Brazil - TCCA (07/2014)	R\$ 4.550.000,00	R\$ -	R\$ -		
COMPERJ (Petrolbras) - TCCA (02/2011)	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -		
Construção Naval do Açu (OSX) - TCCA (05/2011)	R\$ 54.385,00	R\$ -	R\$ -		
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	R\$ 41.034.000,00	R\$ -	R\$ -		
CTR SR (SEBR) - TCCA (02/2010)	R\$ 37.418.878,28	R\$ -	R\$ -		
Impulsão Infra. Ufr. Campos - TCCA (08/2012)	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ -		
Itaipui Tessa - TCCA (15/2012)	R\$ 465.820,67	R\$ -	R\$ -		
Maria Imperial - TCCA (10/2015)	R\$ 9.360.000,00	R\$ -	R\$ -		
Milim CRB II - TCCA (06/2012)	R\$ 2.218.300,00	R\$ -	R\$ -		
Ponte do Açu (LLX) - TCCA (12/2009)	R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ -		
Quilombos - TCCA (09/2012)	R\$ 7.846.000,00	R\$ -	R\$ -		
Sistema Dinâmico Campos - TCCA (07/2013)	R\$ 22.253.877,14	R\$ -	R\$ -		
Terminal Marinho da Ufr. Guelbs - Vale - TCCA (12/2012)	R\$ 208.197,00	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 3.995.500,00	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -		
				R\$ 573.694,52	R\$ 80.821.624,14

Banco Bradesco Agência 8988
conta 3000.7

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
 Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de Operações de Projetos por período
 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018

Situação do Depósito	Valor nominal (avaliado para repasse ao FMA/Fundo)	*Saldo transferido para o IDG (em Agosto de 2018)	Entrada de Recursos Agosto/2018	Rendimento - Tarifas Agosto de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Agosto de 2018
Slava Bergoniê Rocha - TC 00072017	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Miguel Mourão Lima - TC 00652017	R\$ 128.932,14	R\$ -	R\$ 6.527,90		
Puchera Caraca - TC 00492017	R\$ 2.951,00	R\$ -			
Playborde Distribuidora - TC 00942017	R\$ 89.528,57	R\$ -			
CDG Centro Comercial LTDA - TC 01102017	R\$ 33.073,21	R\$ -			
Leandra Queiroz Peroto - TC 00082017	R\$ 20.330,78	R\$ -			
MRV MRL Guanus - TC 00142017	R\$ 117.876,26	R\$ -			
V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC					
TAC CBM					
TAC CHEVRON					
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes					
Banco Bradesco agência 8868 conta 3009-0	R\$ 7.126.250,00	R\$ -		R\$ 43.360,07	R\$ 9.583.205,30
Banco Bradesco agência 8868 conta 3010-4	R\$ 6.733.822,97	R\$ 10.036.705,05			
OF Campos - PMN das Águas	R\$ 4.000.000,00	R\$ -		R\$ 57.906,09	R\$ 5.783.282,08
TOTAL	R\$ 275.906.392,32	R\$ 45.318.956,10	R\$ 6.527,90	R\$ 691.697,59	R\$ 141.882.825,76

* A coluna Saldo Transferido para o IDG trata-se dos recursos transferidos para a conta do novo gestor operacional conforme ofícios SEASAP 225/17 e 226/17, ambos datados em 05/07/2017.

** O TCCA Campos 03/2010 teve uma transferência parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00, conforme solicitado nos ofícios supracitados.

*** Conforme solicitação da SEA, o fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no instrumento I (e) Carteira CCARJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018.

**** Em 10/05/2018 foi transferido o valor de R\$ 10.036.705,05 alocado no Instrumento Operacional Outras Fontes para o IDG. O valor corresponde a R\$ 6.733.822,97 de repasse FMA/Fundo + R\$ 2.062.413,29 (rendimentos no âmbito da convênio) + R\$ 1.240.469,40 (rendimentos no âmbito do Acordo 04/2018).



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de Operações de projetos consolidado
02 de Setembro de 2016 a 31 de Agosto de 2018

Situação do Depósito	Valor nominal guardado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos Tarifas
Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.202.633,78	R\$ 1.202.633,78	R\$ -	R\$ -
Caixa de Japoi Feeduc GÁS-UP - TCCA (13/2007)	R\$ 809.145,00	R\$ 646.749,91	R\$ 646.749,91	R\$ -	R\$ -
Porto da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)	R\$ 1.402.297,92	R\$ 654.665,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transalpínica - TCCA (01/2013)	R\$ 6.555.193,87	R\$ 7.939.400,56	R\$ 7.939.400,56	R\$ -	R\$ -
Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)	R\$ 1.093.116,72	R\$ 89.614,75	R\$ 89.614,75	R\$ -	R\$ -
Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)	R\$ 232.570,53	R\$ 346.328,88	R\$ 346.328,88	R\$ -	R\$ -
Aplicável São José - TCCA (04/2014)	R\$ 260.109,47	R\$ 304.100,55	R\$ 304.100,55	R\$ -	R\$ -
CCR Dutra - TCCA (06/2013)	R\$ 1.620.955,77	R\$ 1.929.095,21	R\$ 1.929.095,21	R\$ -	R\$ -
Compost Uno - TCCA (10/2012)	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.975.193,81	R\$ 1.975.193,81	R\$ -	R\$ -
Expansão Bela Vista - TCCA (05/2015)	R\$ 249.950,72	R\$ 262.190,98	R\$ 262.190,98	R\$ -	R\$ -
Gasoduto Guapimirim - TCCA (09/2013)	R\$ 352.855,55	R\$ 454.830,41	R\$ 454.830,41	R\$ -	R\$ -
Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	R\$ 514.810,70	R\$ 650.085,22	R\$ 650.085,22	R\$ -	R\$ -
Libra Terminal - TCCA (01/2012)	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.419.274,84	R\$ 1.419.274,84	R\$ -	R\$ -
Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)	R\$ 91.450,72	R\$ 119.228,40	R\$ 119.228,40	R\$ -	R\$ -
Lula Buenos Aires (Agril) - TCCA (13/2013)	R\$ 210.000,00	R\$ 260.321,85	R\$ 260.321,85	R\$ -	R\$ -
Lula Buenos Aires (Agua) - TCCA (13/2013)	R\$ 188.889,04	R\$ 234.262,97	R\$ 234.262,97	R\$ -	R\$ -
Lotium - TCCA (25/2012)	R\$ 296.772,80	R\$ 540.784,81	R\$ 540.784,81	R\$ -	R\$ -
LT Macaé Campos III Fumes - TCCA (09/2014)	R\$ 074.203,64	R\$ 983.599,99	R\$ 983.599,99	R\$ -	R\$ -
Multicab - TCCA (04/2013)	R\$ 319.028,27	R\$ 159.100,04	R\$ 159.100,04	R\$ -	R\$ 70.895,70
PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)	R\$ 1.740.292,51	R\$ 1.811.920,89	R\$ 1.811.920,89	R\$ -	R\$ -
Recabçoquio Tocantins/Reduc - TCCA (08/2014)	R\$ 15.950.973,29	R\$ 9.982.572,25	R\$ 11.790.757,87	R\$ -	R\$ 1.928.185,62
Terminal Sul LIX - TCCA (11/2012)	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.064.979,07	R\$ 2.064.979,07	R\$ -	R\$ -
Terreiro Sulmerino Embrastop Compet - TCCA (02/2013)	R\$ 588.308,57	R\$ 790.129,95	R\$ 790.129,95	R\$ -	R\$ -
UTE Porto do Açu - TCCA (03/2012)	R\$ 119.682,82	R\$ 181.619,23	R\$ 181.619,23	R\$ -	R\$ -
CTR (Ineural) - TCCA (11/2009)	R\$ 7.224.500,21	R\$ 4.333.353,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gasduc II TAG - TCCA (12/2008)	R\$ 2.746.051,12	R\$ 991.138,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gruta Furada Transalpínica (PMBJ) - TCCA (08/2010)	R\$ 1.772.591,00	R\$ 2.681.247,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Metro CAB - TCCA (01/2010)	R\$ 620.662,57	R\$ 542.968,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PCH Paracambi Lighter - TCCA (28/2008)	R\$ 900.000,00	R\$ 856.023,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	R\$ 616.000,00	R\$ 463.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.149.635,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação Porto Susseia - TCCA (06/2015)	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.858.283,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GAL Petrolbras - TCCA (07/2015)	R\$ 54.950,00	R\$ 54.937,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação CTR Saly Basozan - TCCA (02/2011)	R\$ 41.634.000,00	R\$ 32.563.266,26	R\$ 10.125.000,00	R\$ -	R\$ -
COMPETJ (Petrobras) - TCCA (03/2010)	R\$ 37.416.678,28	R\$ 30.153.882,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção Naval do Açu (CSN) - TCCA (05/2011)	R\$ 34.772.058,24	R\$ 4.147.998,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	R\$ 405.920,97	R\$ 59.505,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CTR SR (SERFF) - TCCA (02/2009)	R\$ 9.350.000,00	R\$ 12.186.050,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Implantação Incha Urb. Compet - TCCA (09/2012)	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.528.798,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Itaquil Tocantins - TCCA (15/2012)	R\$ 63.829,75	R\$ 80.505,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mariano Imperial - TCCA (16/2013)	R\$ 7.845.000,00	R\$ 9.830.014,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Metro CRB II - TCCA (06/2012)	R\$ 22.253.877,14	R\$ 17.062.941,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porto do Açu (LIX) - TCCA (12/2009)	R\$ 299.197,00	R\$ 281.036,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Quilume - TCCA (04/2012)	R\$ 3.599.500,00	R\$ 4.760.039,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema Distribuição Compet - TCCA (07/2013)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Banco Bradesco agência
6898 conta 3000-7

R\$ 15.303.390,47

R\$ 412.000,00



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de Operações de projetos consolidado
02 de Setembro de 2016 a 31 de Agosto de 2018

Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Fundo	Total de Recursos Transferidos para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IOG	*Total de Entradas de Recursos Acordo	Total de Rendimentos Tarifas
II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal					
Terminado Matrimônio da Ilha Guabuba - Váli - TCCA (12/2012)	R\$ 450.000,00	R\$ 80.752,53	R\$ -	R\$ -	
UPGN Coropéi - TCCA (14/2013)	R\$ 9.038.967,39	R\$ 10.076.336,94	R\$ -	R\$ -	
UTE Baseada em Luminosos Fibrobril - TCCA (17/2011)	R\$ 4.407.506,77	R\$ 227.691,72	R\$ -	R\$ -	
UTE Sertão Cruz - TCCA (03/2014)	R\$ 630.820,25	R\$ 640.151,30	R\$ -	R\$ -	
Desajustem de LESUL - LIX - TCCA (03/2014)	R\$ 5.454.293,76	R\$ 2.572.067,35	R\$ 3.783.041,55	R\$ 1.058.334,56	
CTR Bedford Roxo - Buschell TCCA (07/2016)	R\$ 449.507,03	R\$ 112.104,11	R\$ -	R\$ 396.433,09	
Caja Rio Minas - TCCA (05/2016)	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
Lot. Bela Vista - TCCA (07/2016)	R\$ 38.247,61	R\$ -	R\$ 38.247,61	R\$ 38.247,61	
Mineração Araca Ltda - EPP - TCCA (09/2016)	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
Drapagem Terminal 1 - (E - PE) - TCCA (02/2016)	R\$ 2.250.000,00	R\$ -	R\$ 937.500,00	R\$ 937.500,00	
Arley A. Carvalho - TCCA (01/2017)	R\$ 31.395,00	R\$ -	R\$ 31.395,00	R\$ 31.395,00	
Silvicultura Econômica - TCCA (02/2017)	R\$ 6.176,83	R\$ -	R\$ 6.176,83	R\$ 6.176,83	
CTR Três Rios - TCCA (03/2017)	R\$ 102.872,45	R\$ -	R\$ 102.872,45	R\$ 102.872,45	
Estrela do Macaé - TCCA (04/2017)	R\$ 23.390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.390,00	
****Acordo FMA (02/2018 - Inst 1) (Carteira CCAEM)	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.282.250,44	R\$ -	
III - Reserva de Regularização Fundiária					
Mineração Minas Rio - TC (06/2017)	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.842.600,00	R\$ 254.046,44
III - Instrumento Operacional de Doação					
Outras TECAB - TCCA (08/2011)	R\$ 8.298.420,93	R\$ 2.638.313,36	R\$ -	R\$ -	
COMPERJ (Fintreil) - TCCA (03/2016)	R\$ -	R\$ 4.038.790,86	R\$ -	R\$ -	
Constuição Naval de Aço (USX) - TCCA (05/2011)	R\$ -	R\$ 1.172.116,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.119.534,20
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	R\$ -	R\$ 2.229,99	R\$ -	R\$ -	
III - Instrumento Financeiro Fiduciário					
Funbio Fiduciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado					
Cartão Vinculado***	R\$ 3.268.717,35	R\$ 1.745.715,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.046.562,70
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal					
Odinreich Ambiental S/A - TC (03/2016)	R\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.040,00
Razem Construtivos S/A - TC (04/2016)	R\$ 45.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.200,00
Assoc. das Emp. de Derrão Ind. de Santa Cruz e Aljezurais - AEGIN - TC (001/2016)	R\$ 803.828,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803.828,55
REFEEDIN SRF Empreendimentos Imobiliários S/A - TC (02/2016)	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.000,00
Lubral do Brasil Aditivos Ltda - TC (005/2015)	R\$ 457.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 457.800,00
Lubral em Brasil Aditivos Ltda - TC (006/2016)	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00
CF 1 Logística Ltda - TC (007/2016)	R\$ 236.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.700,00
Companhia Distr. de Gás do RJ - CEG - TC (009/2016)	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.200,00
Estrutura de Filburgo Construções Ltda - TC (005/2016)	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.146,00

***** Relatório de Gestão 2018



Nome do Projeto / Instrumento	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Fundo	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos Tarifas
Energia Nova Friburgo - TC (001/2017)	Quitado	R\$ 32.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.500,00	R\$ 233.583,21
Baneta Suris LTDA - TC (02/2017)	Quitado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,00	
Tarif. Água da Coxa - TC (03/2017)	Quitado	R\$ 12.579,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.579,00	
Dombem - TC (006/2017)	Quitado	R\$ 17.003,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.003,00	
Silvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)	Quitado	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.458,12	
Mage Mineração Ltda - TC (008/2017)	Quitado	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.832,14	
Pedreira Carúca - TC (004/2017)	Quitado	R\$ 2.861,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.861,90	
Plyvander Distribuidora - TC (006/2017)	Quitado	R\$ 89.528,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.528,57	
CIDG Centro Comercial LTDA - TC (010/2017)	Quitado	R\$ 33.573,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.573,21	
Leandro Queiroz Pólvora - TC (008/2017)	Quitado	R\$ 25.339,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.339,29	
MRV MRL Guarus - TC (14/2017)	Quitado	R\$ 117.879,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.879,28	
V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC						
TAC CSN	Quitado	R\$ 7.725.250,00	R\$ 10.365.459,14	R\$ -	R\$ -	
TAC CHEVRON	Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.302.294,98
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes						
OF Inicial	Quitado	R\$ 6.733.222,97	R\$ 8.750.833,46	R\$ 10.036.700,66	R\$ -	
OF Complementar	Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.900.819,12	R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ 278.772.109,67	R\$ 241.568.945,20	R\$ 96.979.798,84	R\$ 15.552.732,84	R\$ 29.378.893,41

* A coluna Total de Entrada de Recursos trata-se dos recursos recebidos na conta do Acordo, sendo esses compensados pelos recursos transferidos do Convênio 003/2016 para o Acordo 04/2016 e os eventuais novos recursos recebidos diretamente nessa conta.

** O TCCA Comprij 03/2010 teve uma transferência parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00 conforme solicitado nos ofícios SEAS/SAF 225/17 e 229/17, ambos datados em 05/07/2017.

*** A conta do projeto Cantão Vinculado não foi transferida para o Bradesco conforme as demais, devido a falta de um produto que suprisse as demandas do projeto no novo gestor financeiro

**** Conforme solicitação da SEA, a fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipo de Atividade
2018	8	1	entria Reunião sobre novo projeto e fluxo de recursos				
2018	8	1	Digitalização de documentos e gravação de CD (aproveitamento)	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Jurídico
2018	8	1	Registro de produtos de consultoria	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	1	Reunião Fínica	1,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	2	Registro de entrada de documentos	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	2	Atualização de e-mail sobre retorno do período de férias	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	2	Com a equipe para atualização do andamento das ações do mecanismo	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	2	Reunião com a SEA para tratar de vários assuntos; * Informação para a coordenação sobre	15,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	1	Leitura e resposta e-mail; avaliação no dia 22 do período de férias do projeto, ver	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	1	Elaborar relatório de execução para a conta referente ao período de janeiro a julho/18 para	0,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	1	Verificação e controle de registros e classificações	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	1	Registro, digitalização e distribuição de correspondências	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	1	Faturamento de reembolsos e despesas diversas	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	1	Registro de entrada de documentos	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	1	Reunião SEA	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	1	Reunião interna com a equipe	4	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	1	Elaboração/Liberação Pagamentos FMA	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	1	Elaboração/Aprovação Pagamentos FMA	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	1	Organização de documentos FMA	1,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	1	Análise NFS 12/091	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	6	Edição, redução de qualidade de documentos e envio por e-mail	0,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	6	Registro de entrada de documentos	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	6	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	6	Elaboração de pauta e levantamento de informações para reunião com ASUR	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	7	SEARH paga documentos	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	7	INFO-PAI paga documentos	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	7	Registro de entrada de documentos	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	7	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	3	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	7	Registro de produtos de consultoria	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	8	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	8	Reunião interna com Gerente de Contas	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	8	Reunião com a SEA	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	10	Presidência serviços externos, do ac INEA/SEA	3	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	10	emes gerencia FMA	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	10	* Reunião com a SEA para tratar de vários assuntos; * Reunião com a SEA sobre Plano de tra	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Jurídico
2018	8	10	Reunião com Jaraina, Ana Paula, Felipe Camello, Felipe Serra e Leandro sobre o homologaçã	23,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	10	Leitura e resposta e-mail; auxiliando nos IWAVE da equipe do dia a dia do projeto, reu	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Reunião (relacionamento e operacia) aplicações financeiras, correção anexo N, reembol	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Registro de entrada e distribuição de correspondências	0,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Faturamento de despesas com passagens	0,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	10	Registro de entrada, edição, substituição de documentos e envio de planilha de controle par	1,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	10	Reunião SEA sobre saldos FMA	8	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	10	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	3	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Prescrições Planilha Prestação de Contas para a contabilidade	3	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	10	Elaboração Prestação de Contas Trimestral FMA	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Elaboração Prestação de Contas Trimestral FMA	7,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Desbloqueio pagamentos de impostos para Contabilidade - FMA	6,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Elaboração de GDB de Contas Trimestral FMA	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Comercialização/Cancelações Feitas para trabalhos	2,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Elaboração/Liberação pagamento FMA	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Atetes Prestação de Contas Trimestral FMA	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	10	Análise de NFS 2107/109	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	13	Reunião gerencia	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	13	preparação de pauta para reunião com ASUR/FUNBIO	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Jurídico
2018	8	13	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	0,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	13	Registro de Correspondência	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	14	SEA-PAI paga documentos	1,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	14	INEA-PAI paga documentos	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	14	Registro de entrada de documentos	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	14	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	3	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	14	Expedição	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	14	Registro de Correspondência	1,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	15	Digitalização e registro de entrada de documentos	2,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	15	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	15	Revisão de timesheet para prestação de contas	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	15	Procura de documentos nas bases de mudança	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	15	Reunião SEA	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	16	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Administração (Compras e Contratações)
2018	8	16	revisão do Timesheet para prestação de contas	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	16	Registro de Correspondência	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	17	Prescrições serviços externos, do ac INEA/SEA	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	17	* Comunicação interna sobre a utilização de marco Governo Estadual RJ, * Acompanhame	15,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	17	- ESTORNO DA ESCRITURAÇÃO DA NOTA FISCAL DA TRONJ FMA ACORDO CA DD MÊS DE JU	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	17	Reunião sobre plano de aquisição	0,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Reunião Valente HP (atualização) para SEA	2,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Administração (Compras e Contratações)
2018	8	17	Registro de entrada e distribuição de correspondências	0,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Serviço
2018	8	17	Expedição de documentos	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	17	Ratificação	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	17	Faturamento de reembolsos e despesas diversas	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Administração (Compras e Contratações)
2018	8	17	Reunião de documentos - ação Gerencia	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	17	Registro de entrada de documentos	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	17	Atualização do relatório de execução mensal do projeto	2,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	17	Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto FMA repassada por instrume	2,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	GERAL - "Leitura, organização e respostas aos e-mails"	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	revisão do Timesheet para prestação de contas	2	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	17	Liberação pagamentos FMA	1	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Gerenciamento de projetos
2018	8	17	Organização/Impressão documentos PC trimestral FMA	1,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Liberação pagamentos FMA	2,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Ajuar lançamentos planilha de Prestação de Contas Contabilidade	2,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Digitalização de despesas FMA	4	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Ajuar prestação de contas trimestral FMA	1,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Registro de Documentos CDDC	0,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Organização arquivos PC trimestral FMA	1,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Análise de NFS e emissão de guia do ISS	1,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	17	Registro de Correspondência	1,5	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Financeiro
2018	8	20	entre sobre encerramento formal primeira fase e encaminh de atas trimest	0,25	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	8	20	emes internos sobre licenciamento e risco e possibilidades de uma necessidade de deliberaçã	1,75	VI Operação e Gestão	Acordo FMA Fundo	Jurídico

Detalhamento das Horas por Instrumento	Soma do Horas
I (a) Carteira CA CCA	468,75
"Pré-projeto"	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Rateio Férias	0,5
Ações Implantação PE Lagoa do Açú	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
* Esclarecimento para o Jurídico sobre o Projeto Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú.	0,5
Ações Implantação PE Medanha	7,25
Administração (Compras e Contratações)	1
Correção de relatório de finalização Ações Implant PE Medanha	1
Financeiro	5,25
Elaboração de prestação de contas final do projeto	1,25
Finalização de prestação de contas final do Projeto	2
Elaboração de prestação de contas Final do projeto	2
Apoio aéreo às UCs	8,5
Administração (Compras e Contratações)	2,5
Rateio Férias	1,5
Solicitação de elaboração de contrato e interação junto a ASIJUR referente ao arrendamento de helicóptero para combate aos incêndios	1
Gerenciamento de projetos	0,75
com compras sobre andamento do processo	0,5
* Solicitação ao jurídico para a elaboração do contrato - Hel-Rio Taxi Aéreo - Arrendamento de helicóptero - Protocolo 2018.0406.00017-8.	0,25
Jurídico	5,25
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Maricá Taxi Aéreo Ltda., orientações internas, análise documentos e envio para assinatura.	2,25
Análise documentos da empresa, do helicóptero e do piloto, bem como do TdR para contratação de Hel-Rio Taxi Aéreo, alterações no TdR e envio de em	3
Apoio técnico Infraestrutura UCs	16
Administração (Compras e Contratações)	6
Rateio Férias	2,25
Faturamento Contratos	3,75
Gerenciamento de projetos	2
* Verificação com Gestão de Contratos e Jurídico sobre o cronograma ajustado referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 037/2017 firmado com a em	1,25
* Comunicado ao financeiro sobre o aditivo ao contrato e ao projeto. * Análise e aprovação do cronograma físico financeiro o qual será anexo ao 1º term	0,75
Jurídico	6,75
Verificação dos atuais funcionários da Projconsult e envio de informações à Flevis.	0,5
Acompanhamento envio cronograma ajustado 1º termo aditivo ao contrato nº 037/2017 firmado com a empresa Ambiental Engenharia	0,5
Orientações sobre aditamento ao contrato firmado com Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda., análise do cronograma enviado e entendimentos inter	1
Confeção 2º Termo Aditivo Contrato 037/2017 Funbio e Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda. (assistência técnica em apoio ao gerenciamento das p	1,5
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda., orientações internas, análise documentos e cronograma e i	3
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Ambiental Engenharia.	0,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Apoio Técnico Infraestrutura UC na semana	0,25
CAR nas UCs	26,75
Administração (Compras e Contratações)	20,25
Revisão dos critérios de seleção	2
Interações ref. envio Manifestações de Interesse recebidas para o coordenador do projeto;	6,75
Conversa e troca de e-mail sobre Acordo FMA/RJ - CAR das UCs - Manifestações de Interesse recebidas (17) - Protocolo: 2018.0720.00057-6	0,25
Interações ref. contratação CAR nas UCs	1
Interações ref. Carta Convite;	4,5
Verificação do processo e envio de e-mail ao Manoel CAR das UCs - Manifestações de Interesse recebidas (17) - Protocolo: 2018.0720.00057-6	0,25
Interações ref. envio Carta Convite e esclarecimento de dúvidas;	5,5
Gerenciamento de projetos	6,5
Revisão dos critérios de avaliação.	2
Rateio Férias (13/08 a 01/09)	0,5
Com INEA sobre elaboração da lista curta.	0,5
Com compras para análise da lista curta enviada pelo INEA para envio de cartas convite.	1
* Solicitação ao setor de compras sobre posicionamento do envio da carta convite.	0,25
* Encaminhamento para o coordenador do Critério de avaliação para o processo de contratação de empresa especializada em regularização fundiária, Cadr	2,25
Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	8,5
Administração (Compras e Contratações)	1
Emissão e verificação de relatórios Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	1
Financeiro	7,5
Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,75
Finalização de prestação de contas final do Projeto	2,75
Elaboração de prestação de contas Final do projeto	2
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	7
Administração (Compras e Contratações)	4,5
Rateio Férias	1,25
Contrato 061/2015- faturamento do contrato (03 notas fiscais) Conversa telefônica com a representante da empresa	3,25
Gerenciamento de projetos	0,25
* Análise e aprovação no sistema cérebro do remanejamento de recursos.	0,25
Jurídico	2,25
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Piripi Produtos Alimentares Ltda., orientações internas, análise documentos e envio para assinatura.	2,25
Conservação da Flora Endêmica - Fase II	25,75
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Rateio Férias	1,5
Gerenciamento de projetos	12
* verificação com a SEA sobre o Ofício SEA/SAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018, o qual solicita aditivo de aditivo de valor (R\$ 94.348,00) e prazo (ma	1,75
* Análise e Comunicação ao financeiro sobre aditivo de valor ao projeto; * Comunicação e Gestão de contratos sobre aditivo de prazo e valor ao contrato	4,5

Reunião FUNBIO, JBRJ e SEA sobre o termo de execução.	4
* Solicitação ao financeiro para desconsiderar aditivo ao projeto.	0,25
* Esclarecimento interno sobre o processo de aditivo com o contrato da FIOTEC.	0,5
* Esclarecimento sobre o aditivo ao contrato com a FIOTEC.	1
Jurídico	12
Análise minuta do termo de execução a ser firmado com SEA e JBRJ, bem como do histórico para sua formalização, entendimentos internos e preparação	3
Verificação da possibilidade de aditivo ao contrato com FIOTEC e envio de e-mail com orientações	0,75
Reunião na SEA.	3
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com FIOTEC, orientações internas, análise documental e cronograma e envio para assinatura.	2
exame docs sobre FIOTEC e antes equipe	1
entus internos gerencia sobre contrato fitec	0,5
Alterações no termo aditivo ao contrato firmado com FIOTEC e reenvio.	0,5
Análise da Ata de nomeação dos representantes legais da FIOTEC, atualização do contrato, verificação de pedido de alterações no aditivo e envio de e-m	1,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Conservação Flora Endêmica na semana	0,25
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	2,75
Administração (Compras e Contratações)	2
Rateio Férias	1,25
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5
Preenchimento de planilha e envio de e-mail com os pagamentos lançados.	0,25
Gerenciamento de projetos	0,75
* Acompanhamento junto ao comprador sobre a contratação do seguro do veículo; * Autorização para pagamento do seguro do veículo que acordo com	0,75
Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ	5,75
Administração (Compras e Contratações)	1
Emissão e verificação de relatórios Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ	1
Financeiro	4,75
Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,75
Elaboração de prestação de contas Final de projeto	2
CRAS nas UCs	7,5
Gerenciamento de projetos	2
Estudo e análise da documentação pertinente para instalação de CRAS nas UCs e devolutiva para a INEA.	2
Jurídico	2
Revisão, alterações e comentários nas 3 TDRs para contratação de serviços, obras e aquisições, entendimentos internos e envio.	5,5
Delimitação de UCs Municipais	5,5
Gerenciamento de projetos	0,25
* Comunicado ao financeiro do recebimento do OFÍCIO SEA/SAP nº 427/2018 datado em 17/08/2018, o qual aprova a prestação de contas final do Proj	0,25
Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza	14,25
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Abertura de Para Onde - Projeto Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza	0,25
Gerenciamento de projetos	11,25
* Encaminhamento para a SEA do modelo de ofício para aquisição de bem imóvel/área.	0,25
* Análise do Projeto; * Explicação para a SEA sobre os documentos necessários para prosseguimento do projeto; * Verificação sobre o projeto ser realiza	3
* Análise de novo projeto de Desapropriação da Área inserida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza; * Solicitação ao financeiro, cor	3
* Solicitação ao jurídico sobre a assinatura de Rosa e encaminhamento para a SEA dos Termos de Execução a ser firmado com o Município de Miracema;	5
Jurídico	2
exame docs para desapropriação e outros correlatos + entus internos e ajustes no texto do termo de execução com o município de Miracema	1,5
revisão e rfbancela do AC Miracema	0,5
Supervisão	0,75
Providências para criação do Timesheet do projeto Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza.	0,25
Criação do timesheet do projeto Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza	0,5
Estrutura g/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	12,5
Administração (Compras e Contratações)	7
Rateio Férias	1
Faturamento Contratos	5
Contrato 080/2017- solicitação por e-mail para a SEA encaminhar informar a data para constar no TRA para faturamento	1
Gerenciamento de projetos	5,25
* Análise e encaminhamento para Gestão de contratos do Ofício SEA/SAP nº 368/2018 datado em 25/07/2018, o qual solicita elaboração do 4º aditivo de	1
Com contratos sobre aditivo a partir de demanda da SEA.	0,5
* Encaminhamento de e-mail para o coordenador do projeto solicitando remanejamento de recursos - Aditivo de valor ao Projeto; * Análise do OFÍCIO SE	0,75
* Comunicação ao financeiro sobre aditivo de valor R\$ 57.060,00 conforme OFÍCIO SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 e Ata 35ª Reunião Ordin	2,5
Acompanhamento do aditivo	0,25
* Encaminhamento de alguns documentos para Gestão de Contratos sobre o processo do contrato com a empresa Maricá.	0,25
Jurídico	0,25
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Maricá Têxtil Atêico.	0,25
Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano	4,75
Administração (Compras e Contratações)	1
Emissão e verificação de relatórios Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano	1
Financeiro	3,75
Elaboração de prestação de contas final do projeto	1,75
Elaboração de prestação de contas Final de projeto	2
Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua	2,75
Administração (Compras e Contratações)	1
Rateio Férias	0,5
Arquivamento físico e envio para arquivamento digital referente à aquisição de motocicletas para o município de Santo Antônio de Pádua	0,5
Gerenciamento de projetos	1,75
Cadastro do projeto no sistema e contato com o novo coordenador para repasse de diversas informações.	1,75
Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	7
Administração (Compras e Contratações)	4,5
Interações ref. processo serviço de vigilância operacional	1,75

Interações ref. contratação serviço PJ_Vigias Patrimoniais	2,75
Gerenciamento de projetos	
* Encaminhamento para o novo coordenador do projeto de ficha cadastral para inclusão no sistema.	2,5
* Apoio ao comprador na solicitação de reembolso dos gastos realizados na visita técnica para o processo de contratação.	0,25
* Conversa com o comprador, jurídico e coordenação sobre a contratação dos vigias.	0,75
* Conversa com a coordenação sobre abertura das propostas.	1
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	0,5
Administração (Compras e Contratações)	64,75
Rateio Férias	17,25
Faturamento de notas fiscais no RIM.	4,25
interações ref. serviço de fornecimento de combustível	1
Faturamento Contratos	0,5
Interações ref. serviço de manutenção e fornecimento de combustível;	4
interações ref. serviço de manutenção;	2,5
Contrato 046 / 2018 - Elaboração , envio para assinatura e e-mail do Termo de Autorização para início do Serviço referente ao Contrato da Pricewaterhou	1,25
Gerenciamento de projetos	3,75
Rateio Férias	11,25
Rateio Férias (13/08 a 01/09).	0,5
* Esclarecimento para o Jurídico sobre a elaboração do Termo de Autorização de Início dos Serviços.	1,25
Diversos entendimentos sobre a solicitação de aditivo aos contratos com a Icone e LUCUS.	0,25
Com gestão de contratos sobre aditivo	0,75
Com fornecedor, compras e ASJUR sobre o aditivo ao contrato com a LUCUS.	0,5
* Solicitação ao setor de compras dos valores pagos à empresa Ticket Log referente às contratações Manutenção de Viaturas Oficiais e Contratação de se	1
Entendimentos junto à gerência, contratos e jurídico sobre os aditivos aos contratos em andamento (Icone e Lucus).	0,25
Com gestão de contratos sobre aditivo LUCUS	1,25
* Encaminhamento para Gestão de contratos e Jurídico do fluxo para pagamento à empresa Price.	1
com gestão de contratos sobre aditivos.	0,25
* Solicitação ao comprador da situação dos valores dos contratos com a Ticket Log; * Tentativa de reclassificação de Insuano no câmbio i; * Abertura de	3
Jurídico	1,25
Verificação de regras para acesso ao portal gestão de terceiros da Price, leitura e análise do manual de usuário e das regras, envio de email e realização d	36
Testes plataforma Gestão de Terceiros - PWC - Auditoria Trabalhista	2
Entendimentos internos sobre contrato firmado com a Price e envio da proposta.	1,5
antes João sobre aditivos	0,5
Leitura Relatório de postagem por prestador/departamento PWC, Lucus e Icone, período 08/2018	0,5
Orientações à Rafaela sobre fluxo para pagamento à Lucus e Icone com base nos relatórios da Price.	0,5
Orientações à Rafaela sobre aditamento aos contratos firmados com Icone e Lucus e análise documentos.	0,5
Análise dos relatórios de pendências e divergências sobre as documentações trabalhistas da Lucus e Icone, envio de email com orientações e orientações	1
Acompanhamentos relatórios mês de julho de 2018 - PWC Auditoria trabalhista	3,75
Orientação Paulo para confecção aditivos Lucus e Icone	1
Orientações à Suzana sobre fluxos e procedimentos para gestão de terceiros da Price.	1
Orientações à Rafaela sobre termos aditivos aos contratos com Lucus e Icone e análise documentos.	0,75
Confecção e solicitação de ajustes 3º Termo Aditivo ao Contrato Fumbio e Lucus Ltda - EPP (Serviços de paisagismo e conservação para atender às neces	1,25
Análise e alterações no parecer necessário à emissão do TRA para pagamento da PWC e entendimentos internos.	6
Análise e solicitação ajustes para confecção 4º Termo Aditivo - Icone Serviços Especializados Ltda-ME - Contrato 078/2016 - Serviços de limpeza, asseto e	1
Entendimentos com Rafaela e Gerência sobre documentação trabalhista da Lucus e Icone para pagamento e fluxo de pagamento à Price e análise docos.	4
CONFEÇÃO PARECER PARA TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITE - TRA AUDITORIA TRABALHISTA PWC	1
entes equipe asjur ao contratos e gerência sobre aditivos Lucus e Icone.	3
Revisão final, chancela, impressão e registro protocolo PARECER PARA TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITE - TRA AUDITORIA TRABALHISTA PWC	1
Análise cronograma físico financeiro e solicitação ajustes - 3º Termo Aditivo ao Contrato Fumbio e Lucus Ltda - EPP (Serviços de paisagismo e conservação	3,3
FMA - PWC - Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO - ajuste Fluxo de processos	0,5
Orientação para acesso Câmbio 2.0 e preenchimento TRA - Contrato 046/2018, PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA;	0,75
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Fortalecimento Operacional UC na semana	0,25
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	0,25
Administração (Compras e Contratações)	8
Emissão e verificação de relatórios Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	1
Financeiro	1
Elaboração de prestação de contas final do projeto	7
Finalização de prestação de contas final do Projeto	2,5
Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,25
GERAL I (a)	2,25
Administração (Compras e Contratações)	97
Rateio Férias	5,5
Faturamento de processos FMA com Suzana	0,5
Financeiro	5
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	33,25
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Geral envio dos extratos	1
Geral salvar extrato na rede financeira	0,5
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31/07	0,5
Conferência do relatório de compras e aquisições do Projeto e confecção da prestação de contas mensal	2
baixa contábil no período 23 a 31 de julho	1,75
geral - cobrança de disponibilização do pagamento de FMA	0,75
Pagamentos, saldos, contratos (Mês)	0,75
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente as meses 01-2018 a 06-2018.	9
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	2,5
Geral - atualização de saldo	0,75
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 10/08	0,25
Conciliação bancária c/c e t/a ref. o mês 07-2018.	3
	2,5

PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	2
Reixa contábil no período 01 a 10 de agosto	1
Reunião com compras para fechamento das relatórias de bens adquiridos para inclusão nas pcs finais de projetos	3
Gerenciamento de projetos	
Rateio Férias	57,75
Rateio Férias (13/08 a 01/09)	2,75
* Comunicado à SEA e ao financeiro do cancelamento de vários projetos sinalizados no ofício SEA/SAP nº 331/2018 datado em 11/07/2018; * Cancelame	15,5
Elaboração e envio para a SEA de planilha com todos os projetos executados com recursos das TCCAs indicados.	1
Com compras sobre plano de aquisição	1,25
Reunião sobre saldos disponíveis e comprometidos na Instrumento CCA para execução de projetos após erro no cálculo realizado pela SEA para realizar o	2
Gerar: Providências para o cancelamento de alguns projetos e análise do saldo disponível no instrumento.	8
Contato com um parceiro de um dos projetos finalizados para entendimentos sobre atestado de capacidade técnica.	0,5
Acompanhamento dos processos de contratações abertas pelo FMA no âmbito do instrumento de CA.	0,5
Diversas atualização no plano de aquisições e encaminhamento interno do documento.	1,25
Com compras sobre os relatórios de finalização de projetos.	2,5
análise de tabelas enviadas pelo Financeiro e SEA sobre recursos comprometidos e disponíveis no Instrumento CCA.	0,5
Análise da proposta de fluxo apresentada pela gestão de contratos.	3
Reunião com compras sobre plano de aquisição e prazo das contratações.	0,5
* Solicitação ao financeiro para finalização de alguns projetos; * Encaminhamento para o financeiro do OFÍCIO SEA/SAP nº 385/2018 datado em 03/08/21	1,5
* Verificação com o jurídico sobre o processo de contratação de terceirização.	6
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails recebidos no período de licença paternidade	0,75
* Encaminhado para a SEA a Prestação de contas final do Projeto Fortalecimento da Infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes	6
Atualização com equipe sobre o andamento dos projetos.	0,25
Jurídico	4
Atualização andamento IC nº 1.30.002.000215/2017-72 (sobre o acompanhamento da atuação do Fumho e adoção de medidas de aproximação deste ps	0,5
Implantação Componente Biota BDE	0,5
Administração (Compras e Contratações)	2,5
Rateio Férias	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Solicitação à Gestão de contratos do posicionamento referente ao contrato nº 058/2015 - Codex Remote	1,5
* Solicitação à Gestão de contratos na substituição do segundo termo aditivo registrado no CEDOC	0,25
* Encaminhamento para a SEA do contrato e aditivos firmados com a empresa Codex Remote; * Solicitação de posicionamento à Gestão de contratos ref	0,25
Jurídico	1
Verificação do termo aditivo ao contrato firmado com Codex Remote e envio.	0,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Implantação Componente Biota - BDE na semana	0,25
Incremento de gestão da visitação nas Ucs	0,25
Administração (Compras e Contratações)	13,5
Interações ref. envio Carta Convite, Incremento da gestão da visitação	11,5
Interações ref. contratação PJ	8,25
Interações ref. dúvidas levantadas pelas empresas participantes do processo.	2,5
Gerenciamento de projetos	0,75
* Encaminhamento para a coordenadora do projeto o TdR e Critério de avaliação.	0,5
* Envio para o comprador de cronograma do processo de contratação.	0,25
Jurídico	0,25
exame docs processo seletivo + elaboração de e-mail e antes internos	1,5
Modelagem Piloto PPP	1,5
Administração (Compras e Contratações)	37
Rateio Férias	1,25
Correção de relatório de finalização PPP	0,25
Financeiro	1
Elaboração de prestação de contas final do projeto	8,75
Finalização de prestação de contas final do Projeto	4,25
Elaboração de prestação de contas Final de projeto	2,5
Gerenciamento de projetos	2
* Esclarecimento para a Gestão de Contratos sobre a rescisão do contrato nº 062/2015 firmado com as empresas Radar PPP Ltda, Manesco, Perez, Azev	7
* Encaminhamento para Gestão de contratos, Compras e Jurídico da rescisão do contrato nº 062/2015 firmado com as empresas Radar PPP Ltda, Manesi	0,25
* Elaboração dos cálculos de solicitação e pagamento para as empresas Casa Cause / Manesco, Rantires, Perez, Azevedo Marques / Radar PPP - Ltda / Pte	2,75
PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	4
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Rateio Férias	0,25
Parna Tijuca - Rio Cariaca	0,25
Administração (Compras e Contratações)	4,25
Rateio Férias	3,5
Faturamento Contratos	0,5
Gerenciamento de projetos	3
Acompanhamento da cobrança à SEA referente ao pagamento da empresa contratada;	0,5
* Verificação com a SEA sobre o produto 14 do contrato nº 120/2016.	0,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PARNA Tijuca - Rio Cariaca na semana	0,25
Parna Tijuca - Sinalização	0,25
Administração (Compras e Contratações)	16
Rateio Férias	3,75
contato com fornecedor para cobrança de entrega das placas e instalação.	1,25
contato com fornecedor para esclarecimentos sobre pagamentos e cláusulas do contrato	1
Troca de e-mail sobre ACORDO FMA/RJ - Sinalização - Projeto Floresta da Tijuca.	1
ACORDO FMA/RJ - Troca de e-mail sobre reinício do processo de Sinalização - Projeto Parna Tijuca - Sinalização - FMA/RJ	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
* Análise de substituição do cronograma físico financeiro - 1º Termo Aditivo Contrato 130/2017 MG Produção e Comunicação Visual Ltda - ME.	10,25
	0,5

Entendimentos internos sobre a possibilidade de editar o contrato em andamento.	0,5
Enres entre gerencia e juridico sobre proposta de adequação de cronograma apresentado pelo fornecedor.	0,5
* Análise da substituição do cronograma físico financeiro - 1º Termo Aditivo Contrato 130/2017 MG Produção e Comunicação Visual Ltda - ME; * Contato	1
* Contato com a empresa e coordenador do projeto sobre Análise da substituição do cronograma físico financeiro - 1º Termo Aditivo Contrato 130/2017	1,75
* Contato com a empresa contratada, coordenador e SEA sobre aditivo ao contrato; * Verificação com o setor de compras sobre novo aditivo de mais plê	5
Jurídico	2
Verificação da possibilidade de alteração no aditivo ao contrato firmado com MG Produção e Comunicação Visual Ltda - ME e envio de email.	0,5
Verificação de possibilidade de aditamento ao contrato firmado com MG Produção e Comunicação Visual Ltda - ME e envio de email.	0,5
Alterações no termo aditivo ao contrato firmado com MG Produção e envio de email à Gerência com pendências.	1
PE Cunhembebe – Aquisições para a sede	1,25
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Rateio Férias	0,5
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Digitalização, registro e identificação de processos de compras (Apoio UO Compras)	0,25
Gerenciamento de projetos	0,5
Rateio Férias (13/08 e 01/09)	0,5
PE Ilha Grande - Geradoras	4,25
Administração (Compras e Contratações)	3,75
Rateio Férias	1,75
Faturamento Contratos	2
Supervisão	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE Ilha Grande - Geradoras na semana	0,5
PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase	4,5
Administração (Compras e Contratações)	4,25
Rateio Férias	0,25
Faturamento Contratos	4
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE Serra da Concórdia Obras e Aquisições na semana	0,25
PM e Implantação APA do Rio Guandu	5,5
Administração (Compras e Contratações)	1
Correção de relatório de finalização APA Rio Guandu	1
Financeiro	4,5
Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,5
Elaboração de prestação de contas Final do projeto	2
Projeto APA do Rio Macaú	1
Administração (Compras e Contratações)	1
Rateio Férias	0,5
Confirmação de entrega junto a UC, envio de NF e solicitação de emissão de TRA referente ao mini trator e recolhedor de resíduos para a APA do Rio Ma	0,5
ProUC - Criação UCs Municipais	7,75
Administração (Compras e Contratações)	6,25
Rateio Férias	0,25
Publicação da solicitação e cronograma de prazos - Projeto ProUC - Criação UCs Municipais - FMA/RJ	0,25
Interações ref. consultoria PJ_ Planejamento e Gestão de UCs	5,75
Gerenciamento de projetos	1,5
Rateio Férias	0,25
Rateio Férias (13/08 e 01/09)	0,5
* Encaminhamento para a Gerência e Compras do TdR e critério de avaliação; * Elaboração do cronograma para o processo de contratação e envio para	0,75
RPPN - Fase V	7,5
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Publicação Projeto RPPN – Fase V - FMA/RJ	0,25
Gerenciamento de projetos	7,25
organização e revisão dos TdR e Critérios de Avaliação.	1,5
Encaminhamento dos TdR e critérios de avaliação e solicitação de cronograma do processo de contratação.	0,5
Elaboração e validação de proposta de cronograma para processo de contratação prevista no projeto.	1
com compras obra a publicação.	0,75
* Comunicação ao setor de compras da Aprovação de soldatção e cronograma de prazos; * Elaboração do cronograma e encaminhamento para aprovaç	3,5
RPPN- UCs INEA	30,75
Administração (Compras e Contratações)	20,25
Rateio Férias	1,5
Contrato 046/2016- faturamento do contrato	2
Faturamento de notas fiscais no RM	0,25
Cadastrando fornecedores para o processo. Inserindo processo no sistema.	5
Finalizando processo no sistema.	4
Resolvendo pendências do processo.	3,5
Gerenciamento de projetos	4,75
Rateio Férias	0,5
* Verificação e encaminhamento para Gestão de contratos sobre aditivo ao contrato firmado com a empresa Projconsult; * Explicação para a coordenaç	1
Com contratos e com fornecedor sobre pagamento e aditivo.	1
* Encaminhamento dos documentos corrigidos para Gestão de contratos sobre o 2º aditivo a ser firmado com a empresa Projconsult.	0,25
* Confirmação de participação no lançamento do livro RPPN; * Elaboração na especificação de fornecimento de brunch para o lançamento do livro RPPN.	1
* Elaboração de Especificação serviço brunch - Projeto RPPN - UCs INEA; * Solicitação ao coordenador do projeto para Pagamento de 50% referente ao fi	1
Jurídico	5,5
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Projconsult, análise CFF, cronogramas, TdR e contrato, alterações no CFF, revisão de cronogramas, en	4
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Projconsult.	0,5
Registra protocolo e controle 2º aditivo Projconsult Engenharia de Projetos Ltda. - Contrato 046/2016 - RPPN	0,5
Verificação dos atuais funcionários da Projconsult e envio de informações à Flavia.	0,5
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RPPN UCs INEA na semana	0,25
RVS Ventania	5,25

	1
Gerenciamento de projetos	1
revisão do termo de execução com o município	4,25
Jurídico	0,5
revisão termo de execução	3
Análise e alterações no Termo de Execução de Miracema, envio e entendimentos internos.	0,75
Revisão final das alterações no termo de execução a ser firmado com Município de Miracema e SEA.	6,75
SERF - Fase V	1,75
Administração (Compras e Contratações)	1,5
revisão dos critérios de seleção.	0,25
Projeto SERF - Fase V - FMA/RJ - Publicação no site	5
Gerenciamento de projetos	1,5
organização e revisão dos TdR e Critérios de Avaliação.	0,5
Encaminhamento dos TdR e critérios de avaliação e solicitação de cronograma do processo de contratação.	1
Elaboração e validação de proposta de cronograma para processo de contratação prevista no projeto.	2
* Elaboração do cronograma para a contratação; * Aprovação de solicitação no sistema cêrebro e encaminhamento de e-mail para o setor de compras; *	8
SERF - UCs INEA	1
Administração (Compras e Contratações)	1
Ratão Férias	7
Financeiro	2,5
Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,5
Finalização de prestação de contas final do Projeto	2
Elaboração de prestação de contas Final de projeto	0,25
SERF3 (NUREF)	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
* Comunicado ao financeiro do OFÍCIO SEA/SAP nº 313/2018 datado em 29/06/2018, o qual aprova a prestação de contas final do Projeto.	5,5
UPAMs PI ERJ	1
Administração (Compras e Contratações)	1
Correção de relatório de finalização UPAM.	4,5
Financeiro	2
Elaboração de prestação de contas final do projeto	2,5
Elaboração de prestação de contas Final de projeto	2,75
I (b) Carteira CA Federal	2,75
GERAL I (b)	2,75
Financeiro	1,5
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente os meses 01-2018 à 06-2018.	0,5
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	0,75
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 07-2018.	35
I (c) Reserva Reg. Fundiária	6,75
GERAL I (c)	5,25
Financeiro	0,5
Geral enviar extrato na rede financeira	1
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente os meses 01-2018 à 06-2018.	0,5
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	0,5
Geral - atualização de saldo	0,75
Conciliação bancária c/a ref. o mês 07-2018.	2
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1,5
Gerenciamento de projetos	1,5
Avaliação e aprovação das solicitações para pagamento da guia judicial	8,25
Provisionamento de Fundos RF - INEA	0,25
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Registro da entrada de documentos.	8
Gerenciamento de projetos	0,5
Ratão Férias (13/08 a 01/09).	0,5
* Verificação com TI sobre a qualidade do arquivo a ser inserido na solicitação de regularização fundiária.	0,75
Diversas interações para pagamento de guia de regularização fundiária encaminhada pelo ofício 366/2018.	3,5
* Solicitação de complemento para pagamento de guia de regularização fundiária - FMA/RJ; * Troca de e-mails com a coordenadora do projeto solicitando	0,75
Diversas interações para o pagamento de guias judiciais.	0,25
* Verificação com a equipe de TI sobre o totalizador de saldos no Núcleo Guaratiba.	0,25
* Verificação com a tesouraria e setor a pagar sobre o número do processo da guia para pagamento judicial.	1,5
* Dúvidas e tratamento sobre o OFÍCIO SEA/SAP nº 431/2018 e OFÍCIO/INEA/DIBAPE/DIRETORIA ADJUNTA nº 192, verificamos que na documentação do	148
III Instr. Financ. Fiduciário	138
CARTÃO VINCULADO	7,5
Apoio Administrativo e Comunicação	7,5
Registro da entrada de documentos	127
Financeiro	0,5
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	2,5
Conferência Recargas Cartão vinculado aprovadas pela Isabella	16
Análise de prestação de contas referente ao cartão vinculado.	8
Solicitação de acertos referente a prestação de contas.	3
Solicitação de Guias de ISS para a contabilidade e envio para as unidades.	9
Envio de e-mails de aprovação de prestação de contas.	4
Envio de e-mails de recargas.	33
Aprovação de prestação de contas e lançamentos na RM.	0,75
Baixa contábil no período 23 a 31 de julho	1,5
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente os meses 01-2018 à 06-2018.	0,5
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	1,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 07-2018.	1
Baixa contábil no período 01 a 10 de agosto	2
Solicitação de cancelamento e devolução de saldo do cartão vinculado.	

Geral salvar extrato na rede financeira dos cartões	1
Recargas do cartão vinculado.	15
Envio dos extratos mensais do cartão vinculado.	1,5
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.07	2
Conferência/Aprovação recargas Cartão Vinculado aprovadas pela Isabella	1,25
Aprovação de prestação de conta e e-mails de recargas.	4
Acertos referente a prestação de contas.	13
Cartão - atualização de saldo	0,5
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO PEDIDO DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.08	2,5
Liberação/Conferência Recargas Cartão Vinculado aprovadas pela Isabella	1
Devolução de saldo em caixa do cartão vinculado.	1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 13 A 31.08	1
Gerenciamento de projetos	2,75
Rateio Férias (13/08 a 01/09).	1
* Verificação junto ao financeiro para bloqueio do cartão vinculado do posto de fiscalização Três Picos, Romirique de Oliveira Schmidt.	0,25
Aprovação de 25 solicitações de recargas para os cartões vinculados.	0,75
* Verificação com o financeiro sobre a prestação de contas do Posto de fiscalização dos Três Picos (Salinas) em nome de Romirique de Oliveira Schmidt.	0,75
Supervisão	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Cartão Vinculado na semana	0,75
GERAL III	10
Financeiro	9,5
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente os meses 01-2018 a 06-2018.	1
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	0,25
Conciliação bancária.	7,5
Conciliação bancária c/a ref. o mês 07-2018.	0,75
Jurídico	0,5
entes gerencia sobre realocação de recursos e governança do FF	0,5
IV Instr. Op. Restau. Florestal	2,25
GERAL IV	2,25
Financeiro	2,25
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente os meses 01-2018 a 06-2018.	1
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 07-2018.	0,75
V Instrumento TAC	65,5
GERAL V	16,25
Financeiro	16
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral salvar extrato na rede financeira	0,5
baixa contábil no período 23 a 31 de julho	0,5
Pagamentos, saídas, contratos (Mês)	3
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente os meses 01-2018 a 06-2018.	2,5
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	0,5
Geral - atualização de saldo	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 07-2018.	1,75
Baixa contábil no período 01 a 10 de agosto	0,75
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.07 MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.08 MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	1
Reunião com SPG sobre números do TAC Chevron Estadual	3,5
Gerenciamento de projetos	0,25
* Encaminhamento para o CEDOC dos nomes corretos dos projetos do TAC.	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARRÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	22
Administração (Compras e Contratações)	3
revisão TdR construção sede administrativa	3
Gerenciamento de projetos	19
Rateio Férias	0,75
Rateio Férias (13/08 a 01/09).	7,75
Contato com a equipe do projeto para entendimentos sobre o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e para parabenizar pelo encontro n.	1,25
Análise de TdR que será utilizado para a contratação projetos executivos. Reunião interna entre a gerência e o setor de compras sobre o documento. Env.	7,5
Revisão do TdR para contratação de projeto executivo no âmbito do projeto.	2
* Comunicado ao coordenador do projeto sobre a utilização da marca do Governo Estadual RJ.	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL -RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	3,5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Rateio Férias	0,5
Gerenciamento de projetos	3
Rateio Férias	0,25
Rateio Férias (13/08 a 01/09).	2,5
* Comunicado ao coordenador do projeto sobre a utilização da marca do Governo Estadual RJ.	0,25
V TAC - CSN - Águas de Barra Mansa	7,75
Administração (Compras e Contratações)	7,75
Rateio Férias	5,5
Contrato 014/2018 - faturamento do contrato	2,25
V TAC - CSN - ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	12,75
Administração (Compras e Contratações)	4,25
Rateio Férias	2,5
Contrato 022/2018- faturamento do contrato	1,75
Apoio Administrativo e Comunicação	0,5
Expedição de documentos	0,25
Ajuste em registros e registro de entrada de documentos e ARs	0,25

Gerenciamento de projetos	4,5
Com gestão de contratos sobre reunião a ser realizada no dia 15/08, leitura compreensão do contrato.	1
Reunião com o representante da empresa contratada sobre o andamento do contrato.	2
* Reunião com a empresa Estilo sobre a evolução da obra em Conservatória.	1,5
Jurístico	3,5
Carta n. 524/2018 - Resposta Ofício 1114-18 - Ministério Público RJ - Núcleo Barra do Piraí - ETE Conservatória	2
Revisão, chancela, impressão e registro expedição para envio Carta 524/2018 FMA resposta Ofício 1114-18 - Ministério Público RJ - Núcleo Barra do Piraí	1,5
V TAC - CSN – ETE Pentagna	1
Administração (Compras e Contratações)	1
Rateio Férias	1
V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	2,25
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Rateio Férias	1,25
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Registro da entrada de documentos	0,25
Gerenciamento de projetos	0,5
* Encaminhamento para a SEA do Contrato nº 088/2017 - Rio Tecnologia Ambiental.	0,25
* Esclarecimento para o coordenador do projeto em relação ao termo de recebimento via sistema cérebro.	0,25
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Monitoramento Paraíba do Sul na semana	0,25
VI Instr. Op. Outras Fontes	3
GERAL VI	3
Financeiro	2,25
Conciliação do projeto financeiro x contábil referente os meses 01-2018 a 06-2018.	1
Revisão da prestação de contas ref. ao 2º trimestre de 2018.	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 07-2018.	0,75
Gerenciamento de projetos	0,75
Rateio Férias	0,25
Rateio Férias (13/08 a 01/09).	0,5
VII Operação e Gestão	345
Acordo FMA Fumbio	345
Administração (Compras e Contratações)	7,25
Reunião SEA	1
Rateio Férias	0,5
Reunião sobre planos de aquisição.	0,75
Resolvendo problemas de relatoria FMA com Leandro.	5
Apoio Administrativo e Comunicação	48
Expedição de documentos	0,5
SEA=foi pega documentos.	2,25
Providências serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,25
Registro, digitalização e distribuição de correspondências	1,5
INEA=foi pega documento.	0,5
Registro de produtos de consultoria	1,25
INEA=foi pega documentos.	1
SEA=foi leva documentos.	1,5
Providências serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,5
Registro de Correspondência	10,25
Expedição	1,25
Registro de entrada e distribuição de correspondências	1,5
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
Registro da entrada de documentos.	6,75
Download de documentos e gravação de CD (apoio Jurídico)	0,5
Verificação e acertos de registros e classificações	1,5
Faturamento de reembolsos a despesas diversas.	1
Edição, redução de qualidade de documentos e envio por e-mail.	0,75
Registro de entrada, edição, substituição de documentos e envio de planilha de controle para gerência	1,25
Digitalização e registro da entrada de documentos	2,5
Procura de documentos nas caixas de mudanças	1
Pesquisa de documentos - apoio Gerência	0,25
SEA=foi leva documentos e pega também.	1
INEA=foi e pega documentos.	0,5
Registro, digitalização e expedição de documentos (apoio Compras Contratos)	1,25
Registro, digitalização e expedição de documentos (apoio Contratos)	0,5
Auxílio para compras	0,75
SEA=foi leva documentos e pega.	1,25
Providências serviços externos, ida ao INEA/SEA, Providências para pagamento referente deslucamento (Mary, João, Leandro, Paulo para participar de re	1,75
SEA=foi levar documentos.	1,25
INEA=foi leva documento, mais sem êxito.	0,5
Acertos do ponto do Gerente de Projetos da área de Obrigações Legais João Ferraz, em função de licença médica da Coordenadora Érika Poverari.	0,75
Financeiro	114,25
Elaboração de prestação de contas mensal de reembolso	2
Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto, revisando as relatorias e coordenando as entregas definidas na ti	5,5
Elaboração Prestação de Contas trimestral FMA	11,75
Elaboração/Aprovação Pagamentos FMA	1
Elaboração/Liberação Pagamentos FMA	3
Emissão de SOES Mensais	6
Elaborar relatório de execução para a pasta referente ao período do janeiro a julho/18 para a Rosa.	0,75
Organização de documentos FMA	1,25
Análise NFSe 12/991	0,5

Reunião com Janaina, Ana Paula, Felipe Camello, Felipe Serra e Leandro sobre o homologação e entendimentos do contratos vendas no RM que será use BRAdesco (relacionamento e operações); aplicações financeiras, correção anexo IV, reembolso Funbio, terceiros e outras. (mês)	1
Reunião SEA sobre saldos FMA	9
Preenchimento Planilha Prestação de Contas para a contabilidade	8
Desbloqueio pagamentos de impostos para Contabilidade - FMA	0,5
Elaboração de SDEs de Contas Trimestral FMA	1
Conferência/Ajuste Conciliações Feitas pela Isabella	2
Ajustes Prestação de Contas Trimestral FMA	2,25
Análise de NFS 259/1339	3
- ESTORNO DA ESCRITURAÇÃO DA NOTA FISCAL DA TICKET FMA ACORDO CA DO MÊS DE JULHO, ASSIM ESTORNANDO O IMPOSTO, CANCELANDO A BAIX	0,25
Atualização do relatório de execução mensal do projeto	2
Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto FMA separada por instrumento	2,5
Liberação pagamentos FMA	7,5
Organização documentos para digitalização FMA	1,75
Organização/Impressão documentos PC trimestral FMA	1
Ajuste lançamentos planilha de Prestação de Contas Contabilidade	1,75
Digitalização de despesas FMA	4
Ajuste prestação de contas trimestral FMA	1,5
Registro de Documentos CEDOC	0,5
Organização arquivos PC trimestral FMA	1,5
Análise de NFS e emissão da guia de ISS	1,5
Atualização do controle comparativo de rendimentos das contas dos instrumentos do FMA	5,25
Elaboração de prestação e contas mensal de reembolso de custos de equipe do projeto	3,5
Revisão do cronograma de desembolsos dos projetos a ser enviado a SEA e Bradesco trimestralmente	2,75
Atualização de planilha de saldos do Projeto	2
Elaboração Planilha despesas mensais para SEA	2
Análise NFS 45/49/48/46	0,5
Análise de NFS : 1351/990/162/84/394/86	0,5
Auxílio para montagem de prestação de contas final	3
Revisão da prestação de contas de reembolso referente ao mês de maio/18.	2
Elaborar base de dados contendo as entregas e prazos para a implementação do KPI da área.	1
Organização Documentos prestação de contas FMA Maio para envio à SEA	1,5
Esclarecimentos PC trimestral FMA p/ SEA	1
Verificação Status prestação de contas final de projeto para gerência FMA	1
Liberação de pagamentos de impostos para contabilidade	1,25
Conferência de SDE's dos projetos	1,25
Upload de arquivos/Registro de Documentos CEDOC	1
Análise de NFS 0064	0,25
Gerenciamento de projetos	154
Reunião SEA	4
Ratão Férias	1,75
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	21
revisão do Timesheet para prestação de contas.	4
Reunião com a SEA.	3
Reunião interna com a equipe.	4
Reunião com a coordenação.	2
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails;	5
Atualização dos e-mails após retorno do período de férias.	6
Com a equipe para atualização do andamento das ações do mecanismo.	2
* Reunião com a SEA para tratar de vários assuntos; * Informação para a coordenação sobre entrada de projetos sem recurso; * Acompanhamento das c	15,25
Elaboração de pauta e levantamento de informações para reunião com ASJUR.	1
Reunião interna com Gestão de Contratos	1
* Reunião com a SEA para tratar de vários assuntos; * Reunião com a SEA sobre Plano de trabalho + metas + indicadores; * Atualização na planilha de pro	21,25
preparação de pauta para reunião com ASJUR/FUNBIO.	0,75
Revisão de timesheet para prestação de contas.	2
* Comunicação interna sobre a utilização da Inanca Governo Estadual RJ; * Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio; * Atualização das	15,25
* Esclarecimento para Gestão de Contratos sobre alguns processos em andamento; * Acompanhamento dos processos; * Encaminhamento de alguns TR.	10
* Verificação com o setor de TI sobre ajustes de alguns pontos no sistema cérebro; * Acompanhamento dos processos em andamento; * Atualização das	13,25
Ratão Férias (13/08 a 01/09).	11,25
* Comunicado à Administração sobre idas do portador do Funbio no INEA e SEA; * Acompanhamentos dos projetos; * Atualização de planilhas; * Solicita	10,25
Jurídico	8,25
entes gerencia FMA	0,25
entes Manoel sobre novos projetos e fluxo de recursos	0,5
reunião gerencia	0,5
entes sobre encerramento formal primeira fase + exame dats e entes internos	0,25
entes internos sobre terceirização e riscos e possibilidades diante necessidade de deliberação CD	1,75
entes gerencia e localização de docs sobre solicitações de contingenciamento de riscos à SEA	1
leitura e análise parecer assessoria jurídica SEA - ofício 327 + elaboração de e-mail e entes Itasa	4
Supervisão	13,25
Revisão Valores III (atualização) para SEA	2,75
fma - análise dos projetos em andamento e pessoal; reunião de nivelamento com equipe	4
GERAL: Timesheet Julho: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	2,5
terceirização	4
Total Geral	1.050,25

Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	468,75
Administração (Compras e Contratações)	139
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Financeiro	87,25
Gerenciamento de projetos	155,25
Jurídico	84
Supervisão	3
I (b) Carteira CA Federal	2,75
Financeiro	2,75
I (c) Reserva Reg. Fundiária	15
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Financeiro	5,25
Gerenciamento de projetos	9,5
III Instr. Financ. Fiduciário	148
Apoio Administrativo e Comunicação	7,5
Financeiro	136,5
Gerenciamento de projetos	2,75
Jurídico	0,5
Supervisão	0,75
IV Instr. Op. Restau. Florestal	2,25
Financeiro	2,25
V Instrumento TAC	65,5
Administração (Compras e Contratações)	17,75
Apoio Administrativo e Comunicação	0,75
Financeiro	16
Gerenciamento de projetos	27,25
Jurídico	3,5
Supervisão	0,25
VI Instr. Op. Outras Fontes	3
Financeiro	2,25
Gerenciamento de projetos	0,75
VII Operação e Gestão	345
Administração (Compras e Contratações)	7,25
Apoio Administrativo e Comunicação	48
Financeiro	114,25
Gerenciamento de projetos	154
Jurídico	8,25
Supervisão	13,25
Total Geral	1.050,25

Por TAC	Soma de Horas
V Instrumento TAC	65,5
GERAL V	16,25
Financeiro	16
Gerenciamento de projetos	0,25
V TAC - CSN – ETE Pentagna	1
Administração (Compras e Contratações)	1
V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	2,25
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Gerenciamento de projetos	0,5
Supervisão	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL – RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - TUBIACANGA	3,5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Gerenciamento de projetos	3
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	22
Administração (Compras e Contratações)	3
Gerenciamento de projetos	19
V TAC - CSN – Águas de Barra Mansa	7,75
Administração (Compras e Contratações)	7,75
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	12,75
Administração (Compras e Contratações)	4,25
Apoio Administrativo e Comunicação	0,5
Gerenciamento de projetos	4,5
Jurídico	3,5
Total Geral	65,5

Resumo Horas por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	468,75
"Pré-projeto"	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Ações Implantação PE Lagoa do Açú	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Ações Implantação PE Medanha	7,25
Financeiro	6,25
Administração (Compras e Contratações)	1
Apoio aéreo às UCs	8,5
Jurídico	5,25
Administração (Compras e Contratações)	2,5
Gerenciamento de projetos	0,75
Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	15
Jurídico	6,75
Administração (Compras e Contratações)	6
Gerenciamento de projetos	2
Supervisão	0,25
CAR nas UCs	26,75
Administração (Compras e Contratações)	20,25
Gerenciamento de projetos	6,5
Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	8,5
Financeiro	7,5
Administração (Compras e Contratações)	1
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	7
Administração (Compras e Contratações)	4,5
Jurídico	2,25
Gerenciamento de projetos	0,25
Conservação da Flora Endêmica – Fase II	25,75
Jurídico	12
Gerenciamento de projetos	12
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Supervisão	0,25
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	2,75
Administração (Compras e Contratações)	2
Gerenciamento de projetos	0,75
Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	5,75
Financeiro	4,75
Administração (Compras e Contratações)	1
CRAS nas UCs	7,5
Jurídico	5,5
Gerenciamento de projetos	2
Delimitação de UCs Municipais	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza	14,25
Gerenciamento de projetos	11,25
Jurídico	2
Supervisão	0,75
Administração (Compras e Contratações)	0,25


Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	12,5
Administração (Compras e Contratações)	7
Gerenciamento de projetos	5,25
Jurídico	0,25
Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano	4,75
Financeiro	3,75
Administração (Compras e Contratações)	1
Fortalecimento de UCs de Santo Antonio de Padua	2,75
Gerenciamento de projetos	1,75
Administração (Compras e Contratações)	1
Fortalecimento Operacional UCs - Vigias	7
Administração (Compras e Contratações)	4,5
Gerenciamento de projetos	2,5
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	64,75
Jurídico	36
Administração (Compras e Contratações)	17,25
Gerenciamento de projetos	11,25
Supervisão	0,25
Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	8
Financeiro	7
Administração (Compras e Contratações)	1
GERAL I (a)	97
Gerenciamento de projetos	57,75
Financeiro	33,25
Administração (Compras e Contratações)	5,5
Jurídico	0,5
Implantação Componente Biota BDE	2,5
Gerenciamento de projetos	1,5
Administração (Compras e Contratações)	0,5
Supervisão	0,25
Jurídico	0,25
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	13,5
Administração (Compras e Contratações)	11,5
Jurídico	1,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Modelagem Piloto PPP	17
Financeiro	8,75
Gerenciamento de projetos	7
Administração (Compras e Contratações)	1,25
PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Publico	0,25
Administração (Compras e Contratações)	0,25
Parna Tijuca - Rio Carioca	4,25
Administração (Compras e Contratações)	3,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Supervisão	0,25
Parna Tijuca – Sinalização	16
Gerenciamento de projetos	10,25
Administração (Compras e Contratações)	3,75
Jurídico	2
PE Cunhambebe – Aquisições para a sede	1,25

Administração (Compras e Contratações)	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
PE Ilha Grande - Geradores	4,25
Administração (Compras e Contratações)	3,75
Supervisão	0,5
PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase	4,5
Administração (Compras e Contratações)	4,25
Supervisão	0,25
PM e Implantação APA do Rio Guandu	5,5
Financeiro	4,5
Administração (Compras e Contratações)	1
Projeto APA do Rio Macacú	1
Administração (Compras e Contratações)	1
ProUC - Criação UCs Municipais	7,75
Administração (Compras e Contratações)	6,25
Gerenciamento de projetos	1,5
RPPN - Fase V	7,5
Gerenciamento de projetos	7,25
Administração (Compras e Contratações)	0,25
RPPN- UCs INEA	30,75
Administração (Compras e Contratações)	20,25
Juridico	5,5
Gerenciamento de projetos	4,75
Supervisão	0,25
RVS Ventania	5,25
Juridico	4,25
Gerenciamento de projetos	1
SERF - Fase V	6,75
Gerenciamento de projetos	5
Administração (Compras e Contratações)	1,75
SERF - UCs INEA	8
Financeiro	7
Administração (Compras e Contratações)	1
SERF3 (NUREF)	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
UPAMs PI ERJ	5,5
Financeiro	4,5
Administração (Compras e Contratações)	1
I (b) Carteira CA Federal	2,75
GERAL I (b)	2,75
Financeiro	2,75
I (c) Reserva Reg. Fundiária	15
GERAL I (c)	6,75
Financeiro	5,25
Gerenciamento de projetos	1,5
Provisionamento de Fundos RF - INEA	8,25
Gerenciamento de projetos	8
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
III Instr. Financ. Fiduciário	148

CARTÃO VINCULADO	138
Financeiro	127
Apoio Administrativo e Comunicação	7,5
Gerenciamento de projetos	2,75
Supervisão	0,75
GERAL III	10
Financeiro	9,5
Jurídico	0,5
IV Instr. Op. Restau. Florestal	2,25
GERAL IV	2,25
Financeiro	2,25
V Instrumento TAC	65,5
GERAL V	16,25
Financeiro	16
Gerenciamento de projetos	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	22
Gerenciamento de projetos	19
Administração (Compras e Contratações)	3
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - TUBIACANGA	3,5
Gerenciamento de projetos	3
Administração (Compras e Contratações)	0,5
V TAC - CSN - Águas de Barra Mansa	7,75
Administração (Compras e Contratações)	7,75
V TAC - CSN - ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	12,75
Gerenciamento de projetos	4,5
Administração (Compras e Contratações)	4,25
Jurídico	3,5
Apoio Administrativo e Comunicação	0,5
V TAC - CSN - ETE Pentagna	1
Administração (Compras e Contratações)	1
V TAC - CSN - Monitoramento Paraíba do Sul	2,25
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Gerenciamento de projetos	0,5
Supervisão	0,25
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
VI Instr. Op. Outras Fontes	3
GERAL VI	3
Financeiro	2,25
Gerenciamento de projetos	0,75
VII Operação e Gestão	345
Acordo FMA Funbio	345
Gerenciamento de projetos	154
Financeiro	114,25
Apoio Administrativo e Comunicação	48
Supervisão	13,25
Jurídico	8,25
Administração (Compras e Contratações)	7,25
Total Geral	1.050,25


Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	458,75
I (b) Carteira CA Federal	2,75
I (c) Reserva Reg. Fundiária	15
III Instr. Financ. Fiduciário	148
IV Instr. Op. Restau. Florestal	2,25
V Instrumento TAC	65,5
VI Instr. Op. Outras Fontes	3
VII Operação e Gestão	345
Total Geral	1050,25

Qtde de Horas por Instrumento (em %)
agosto de 2018

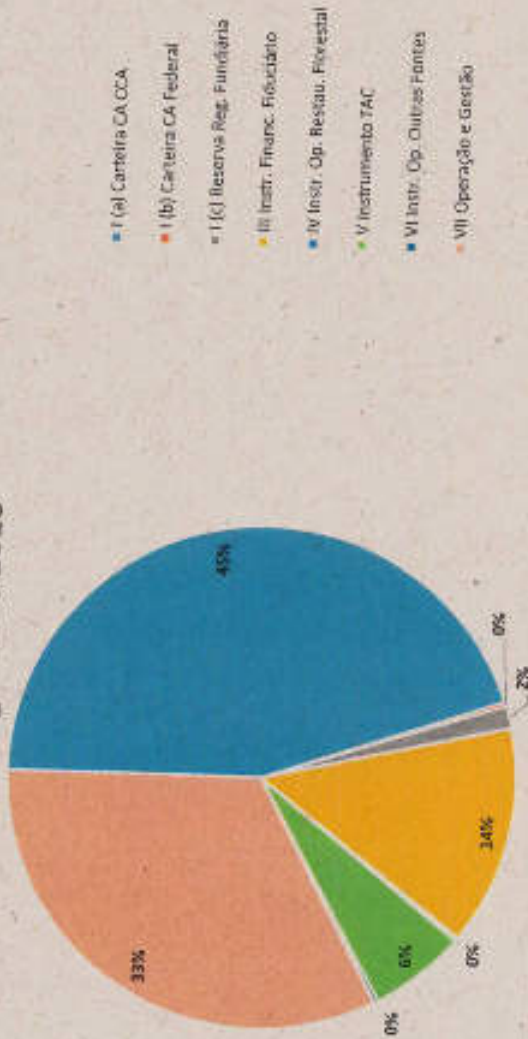


Per Tipologia de Atividade	Soma de Horas
Gerenciamento de projetos	349,5
Financeiro	346,5
Jurídico	96,25
Administração (Compras e Contratações)	164
Supervisão	17,25
Apoio Administrativo e Comunicação	56,75
Total Geral	1050,25

Qtde de Horas por Tipologia de Atividade (em %)
agosto de 2018

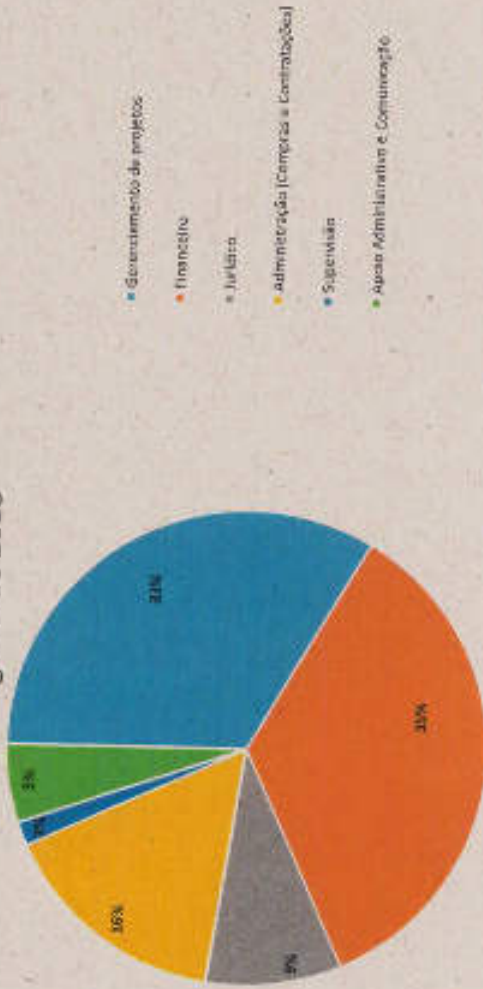


Por Projeto de CA	Soma de Horas
GERAL (16)	97
Fortalecimento Operacional UCS EU	64,75
RPNs - UCS INEA	30,75
CAB nas UCS	26,75
Conservação do Fluxo Endêmico - Fase II	25,75
Monitoragem Plano APP	17
Plano Tijoca - Situação	16
Apoio técnico infraestrutura Uta	15
Desocupação da área PNM Dr. Wilquet Oliveira de Sousa	14,25
Instrumentação do geólio da visitação nas Uts	13,5
Estrutura de Contêineres Invertebrados UCS EU	12,5
Contaminante e Sinalização PE Poço Branco	8,5
Acesso áreas UCs	8,5
SERF - UCS INEA	8
Fortalecimento, Estação e Visitação PE RI	8
Projec - Criação UCS Municipal	7,75
RPN - Fase V	7,5
CBA5 na UCS	7,5
Ações Implementação PE Mladanta	7,25
Fortalecimento Operacional UCS - Vigias	7
US (As firmas) - Aquisição de Supermimex	7
SERF - Fase V	7
Consolidação Gestão do Uso Público UCS RI	7
UPAMIS PE RI	6,75
PM e implementação APA do Rio Tirol	5,75
RVS Ventania	5,5
Exec. Núcleo Babilônia PE Desambagem	5,25
PE Serra Concorde Obras aplicações - 2ª Fase	4,75
PE Ilha Guandu - Geradores	4,5
Plano Tijoca - Rio Carícia	4,25
Fortalecimento de Uts de Santo Antônio de Padua	4,25
Conservação de Flora Endêmica Annonaceae	3,75
Implementação Componente Inixa SDE	2,75
PE Curimantuba - Aquisições para a sede	2,5
Projeto APA do Rio Mocó	1,25
Ações Implementação PE Lagoa do Açu	1
"Sri projeto"	0,5
PARNA Itaipava - Estrutura de uso Público	0,5
SERF (LUREF)	0,25
Delimitação de UCS Municipais	0,25
Total Geral	468,75

Qtde de Horas por Projeto de Compensação Ambiental (em %)
agosto de 2018

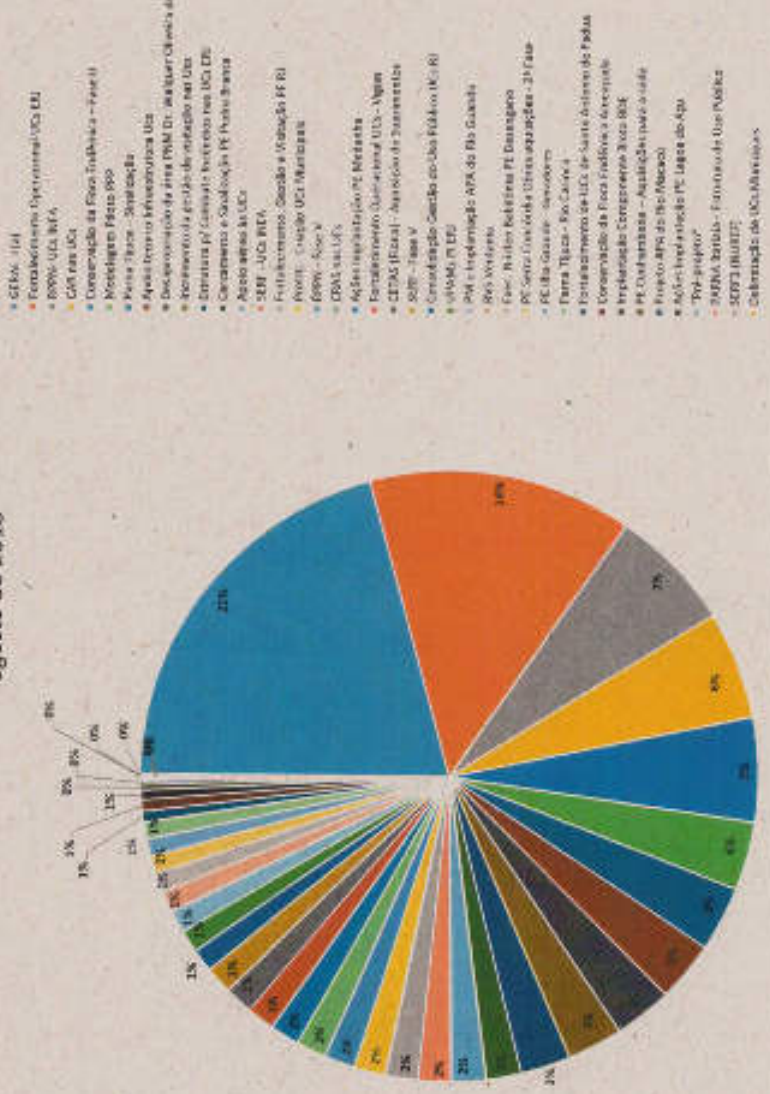

Por Projeto de TAC	Soma de Horas
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARRIO DE PAUA - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL GERAL V	22
VTAC - CSN - ETE CONSERVATORIA - OBRAS	16,25
V TAC - CSN - Águas de Barra Mansa	12,75
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - LUMACANGA	7,75
V TAC - CSN - Monitoramento Proteção do Sul	3,5
VTAC - CSN - ETE Penabágia	2,25
Total Geral	65,5

Qtde de Horas por TAC (em %) agosto de 2018

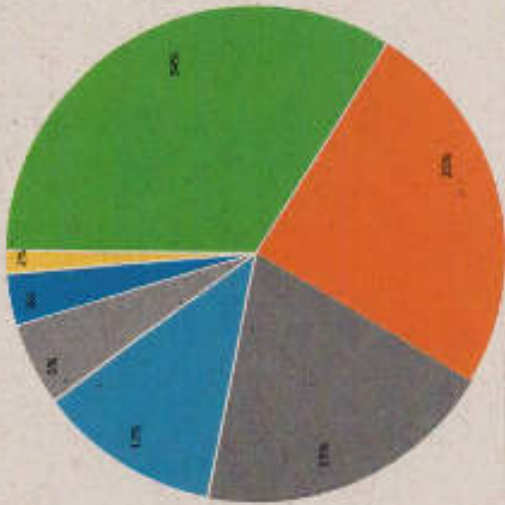

- VTAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARRIO DE PAUA - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL GERAL V
- VTAC - CSN - ETE CONSERVATORIA - OBRAS
- VTAC - CSN - Águas de Barra Mansa
- VTAC - CHEVRON ESTADUAL - RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - LUMACANGA
- VTAC - CSN - Monitoramento Proteção do Sul
- VTAC - CSN - ETE Penabágia

Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC: Reserva de Regularização Fundiária

Período da execução: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de 2018



FUNBIO

Secretaria
do Ambiente

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Solicitado Por
Karla Leite de Oliveira	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Reg Fundiária-INEA-A511- Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Processos sem indicação de TCCA) - Protocolo: 2018.0727.00050-4 - Nº Processo: 00062783620118190031	R\$ 19.113,25	15/08/2018	INEA/SEA
Omar Domingos Gouvea	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Regularização Fundiária - INEA - A511 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Processos sem indicação de TCCA) - Protocolo: 2018.0806.00040-0 - Nº Processo: E-07/	R\$ 186.137,62	14/08/2018	INEA/SEA
Omar Domingos Gouvea	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Regularização Fundiária - INEA - A511 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Processos sem indicação de TCCA) - Protocolo: 2018.0806.00039-6 - Nº Processo: E-07/	R\$ 622,38	14/08/2018	INEA/SEA
